



**KPMG Audit Sénégal S.A.**  
**avec Administrateur Général**  
Immeuble Horizons S.A.  
83, Boulevard de la République  
3<sup>ème</sup> Etage Dakar – Sénégal

Téléphone : + 221 33 849 27 27  
Télécopie : + 221 33 822 17 02  
NINEA : 22486742 S 3 RC : SN-DKR -2003- B -4225

**MISSION DE REVUE INDÉPENDANTE  
DE LA CONFORMITÉ DE LA PASSATION DES  
MARCHÉS DES AUTORITÉS CONTRACTANTES  
AU TITRE DE LA GESTION 2011  
GROUPE I**

**AUTORITE CONTRACTANTE :**  
**SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT  
ET D'EXPLOITATION DES TERRES DU  
DELTA ET DE LA VALLEE DU FLEUVE  
SENEGAL  
- SAED -  
RAPPORT DEFINITIF**

**Autorité de Régulation des Marchés Publics ARMP**

Rue Alpha Hachamiyou Tall x Kléber  
BP 11303 - Dakar - Sénégal

*Ce document contient 62 pages (incluant celle-ci)*

**Réf. : NDS-SP- DSDS-2013-04-728**



## SOMMAIRE

<b>1. SYNTHÈSE</b>	<b>6</b>
<b>1.1 Déroulement de la mission</b>	<b>6</b>
1.1.1 Contexte	6
1.1.2 Modalités d'intervention	7
1.1.2.1 Audit de la passation	7
1.1.2.2 Audit de l'exécution physique	9
<b>1.2 Constats relatifs au dispositif des marchés publics</b>	<b>9</b>
<b>1.3 Constats de l'audit</b>	<b>9</b>
1.3.1 Échantillons	9
1.3.2 Constats généraux relatifs à la passation et à l'exécution des marchés	10
1.3.3 Constats spécifiques relatifs à la passation des marchés	11
1.3.4 Constats spécifiques relatifs à l'exécution financière	12
<b>1.4 Recommandations</b>	<b>12</b>
<b>1.5 Suivi des recommandations de la revue de 2010</b>	<b>17</b>
<b>2. DISPOSITIF ET METHODOLOGIE DE L'AUDIT</b>	<b>19</b>
<b>2.1 Rappel des termes de références</b>	<b>19</b>
2.1.1 Contexte de la mission	19
2.1.2 Objectifs de la mission	20
2.1.2.1 Objectif principal	20
2.1.2.2 Objectifs spécifiques	20
2.1.3 Périmètre de la mission	21
<b>2.2 Méthodologie de mise en œuvre</b>	<b>22</b>
2.2.1 Approche contradictoire	22
2.2.2 Synthèse des phases et étapes de notre intervention	23
<b>2.3 Description des travaux d'audit</b>	<b>24</b>
2.3.1 Audit de la passation des marchés	24
2.3.1.1 Revue des textes	24
2.3.1.2 Analyse de l'environnement de la passation des marchés	24
2.3.1.3 Vérification des différentes étapes de la passation des marchés.	24
2.3.2 Audit de l'exécution financière des marchés	25
2.3.3 Audit technique	25
<b>2.4 Constitution de l'échantillon d'audit</b>	<b>26</b>
2.4.1 Échantillon pour l'audit des aspects liés à la passation des marchés	26
2.4.1.1 Description de l'échantillon	26
2.4.1.2 Correction de l'échantillon	27
2.4.2 Échantillon pour l'audit technique	27
<b>3. AUDIT DU SYSTEME DES MARCHES</b>	<b>28</b>
<b>3.1 Rappels</b>	<b>28</b>
3.1.1 Réglementation en vigueur pour l'exercice contrôlé	28
3.1.1.1 Rappel relatif à la réglementation des marchés publics au Sénégal	28
3.1.1.2 Dispositif institutionnel actuel	29
3.1.2 Principes	30

3.1.2.1	Champ d'application du CMP	30
3.1.2.2	Durée des marchés (article 14 du CMP)	31
3.1.2.3	Seuils de passation de marchés (article 53 du CMP)	32
3.1.2.4	Contrôle à priori de la passation des marchés (arrêté n° 11580 pris en application de l'article 138 du CMP)	32
3.1.2.5	Signature des marchés (articles 27, 28 et 30 du CMP)	33
3.1.2.6	Approbation des marchés	34
3.1.3	Procédures	35
<b>3.2</b>	<b>Constats relatifs au dispositif des marchés publics</b>	<b>35</b>
3.2.1	Responsabilité des MO et MOD	35
3.2.1.1	Modalités de fonctionnement de la CPM	35
3.2.1.2	Capacité de lancer des mises en concurrence	37
3.2.2	Exercice des contrôles	37
3.2.2.1	Rappels	37
3.2.2.2	Exercice des contrôles	38
3.2.2.3	Fonctionnement de la Commission des Marchés de la SAED	39
3.2.2.4	Rôle du Contrôleur Financier	40
3.2.3	Régulation	41
<b>4.</b>	<b>AUDIT DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES</b>	<b>42</b>
<b>4.1</b>	<b>Constats généraux</b>	<b>42</b>
4.1.1	Constats de carence documentaire	42
4.1.1.1	Carence documentaire concernant la passation	42
4.1.1.2	Carence documentaire concernant l'exécution financière	43
4.1.2	Fractionnements potentiels	43
4.1.2.1	Rappels	43
4.1.2.2	Évaluation des fractionnements potentiels	43
<b>4.2</b>	<b>Audit de la passation des marchés</b>	<b>43</b>
4.2.1	Dossiers d'Appels d'Offres (DAO)	43
4.2.1.1	Rappels	43
4.2.1.2	Constats	45
4.2.1.3	Commentaires	45
4.2.2	Avis d'Appels d'Offres (AAO)	45
4.2.2.1	Rappels	45
4.2.2.2	Constats	46
4.2.2.3	Commentaires	47
4.2.3	Réception et dépouillement des offres	47
4.2.3.1	Rappels	47
4.2.3.2	Constats	48
4.2.3.3	Commentaires	48
4.2.4	Évaluations des offres et attribution des marchés	48
4.2.4.1	Rappels	48
4.2.4.2	Constats relatifs à l'évaluation	50
4.2.4.3	Commentaires relatifs à l'évaluation	51
4.2.4.4	Constats relatifs à l'Attribution	51
4.2.4.5	Commentaires relatifs à l'Attribution	51
4.2.5	Cas particulier des marchés passés par entente directe	52
4.2.5.1	Rappels	52
4.2.5.2	Constats	54
4.2.6	Délais de passation des marchés	54
4.2.6.1	Rappels	54
4.2.6.2	Constats	55
<b>4.3</b>	<b>Audit de l'exécution financière</b>	<b>55</b>
4.3.1	Etendue des travaux d'audit du volet financier	55
4.3.1.1	Concernant l'engagement	55

4.3.1.2	Concernant le contrôle et la certification du service fait	55
4.3.1.3	Concernant la liquidation, le mandatement et le paiement des dépenses	55
4.3.1.4	Limites de l'audit de l'exécution financière	56
4.3.2	Constats d'audit sur le volet d'exécution financière	56
4.3.2.1	Production et gestion des garanties contractuelles	56
4.3.2.2	Constats d'audit - Engagement, liquidation et mandatement des dépenses	56
4.3.2.3	Réception et paiement des prestations	57
<b>4.4</b>	<b>Audit de l'exécution physique</b>	<b>57</b>
<b>5.</b>	<b>RECOMMANDATIONS</b>	<b>58</b>
<b>5.1</b>	<b>Recommandations générales</b>	<b>58</b>
5.1.1	Recommandations relatives à l'archivage	58
5.1.2	Recommandations relatives aux rapports et observateurs indépendants	59
5.1.3	Recommandations concernant le déroulement des audits à posteriori	59
<b>5.2</b>	<b>Recommandations relatives au fractionnement</b>	<b>59</b>
<b>5.3</b>	<b>Recommandations relatives à la capacité de gestion du processus de passation des marchés</b>	<b>59</b>
<b>5.4</b>	<b>Recommandations relatives à l'attribution des marchés</b>	<b>59</b>
<b>5.5</b>	<b>Recommandations relatives au renforcement de la régulation</b>	<b>59</b>
	Cf. rapport de synthèse du groupe I.	59
<b>6.</b>	<b>ANNEXE : LISTE DES MARCHES CONTROLES</b>	<b>60</b>
<b>6.1</b>	<b>Liste des DRP contrôlées</b>	<b>60</b>
<b>6.2</b>	<b>Liste des appels d'offres contrôlés</b>	<b>61</b>

## ABREVIATIONS ET ACRONYMES



ABREVIATIONS ET/OU ACRONYMES	APPELLATIONS COMPLETES/DETAILS
<b>AC</b>	Autorité Contractante
<b>AGPM</b>	Avis Général de Passation des Marchés
<b>AO</b>	Appel d'Offres
<b>AOO</b>	Appels d'Offres Ouvert
<b>AOR</b>	Appel d'Offres Restreint
<b>ARMP</b>	Autorité de Régulation des Marchés Publics
<b>BL</b>	Bordereau de Livraison
<b>CFAA</b>	Country Financial Accountability Assessment
<b>CM</b>	Commission des Marchés
<b>CMP</b>	Code des Marchés Publics
<b>CNCA</b>	Commission Nationale des Contrats de l'Administration
<b>COA</b>	Code d'Obligation de l'Administration
<b>CPAR</b>	Country Procurement Accountability Review
<b>CPM</b>	Cellule de Passation des Marchés
<b>DAC</b>	Dossier d'Appel à la Concurrence
<b>DAO</b>	Dossier d'Appel d'Offres
<b>DCMP</b>	Direction Centrale des Marchés Publics
<b>DRP</b>	Demande de Renseignements et de Prix
<b>MEF</b>	Ministère de l'Economie et des Finances
<b>MO</b>	Maître d'Ouvrage
<b>MOD</b>	Maître d'Ouvrage Délégué
<b>N/A</b>	Non applicable
<b>PPM</b>	Plan de Passation des Marchés
<b>PRM</b>	Personne Responsable des Marchés
<b>PV</b>	Procès-verbal
<b>SA</b>	Société Anonyme
<b>SAED</b>	Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitation des terres du Delta et de la Vallée du Fleuve Sénégal
<b>SIGFIP</b>	Système Intégré de Gestion des Finances Publiques
<b>SN</b>	Société Nationale
<b>SPM</b>	Spécialiste en Passation des Marchés
<b>SPPM</b>	Société à Participation Publique Majoritaire
<b>TDR</b>	Termes de référence
<b>UEMOA</b>	Union Economique Monétaire Ouest Africaine

# 1. SYNTHESE

## 1.1 Déroulement de la mission







### 1.1.1 Contexte

Le Gouvernement du Sénégal a réalisé, entre 2002 et 2003, avec l'appui des partenaires au développement, deux (02) exercices d'évaluation :

-  L'un sur les systèmes de gestion des finances publiques ;
-  L'autre sur la passation des marchés publics ;

visant à améliorer la performance de la gestion des finances publiques sénégalaises. Ces exercices ont donné lieu à la production des rapports CFAA - Country Financial Accountability Assessment et CPAR - Country Procurement Accountability Review.

A ces rapports, s'en sont suivies :

-  L'initiation de mesures de réformes budgétaires et la prévision de l'évolution du Code des Marchés Publics ;
-  En 2004, la première mission d'audit à posteriori de la passation de marchés de six (06) ministères clés et celle de huit (08) ministères l'année suivante ;
-  En 2005, la formulation de directives du Conseil des Ministres de l'UEMOA en faveur de l'amélioration harmonisée des systèmes de passation des marchés publics dans l'Union ;
-  La promulgation du Code des Marchés Publics (CMP) au Sénégal en avril 2007 et dans la foulée, la mise en place des nouveaux organes du système de passation de marchés ;
-  En 2011, un nouveau Code des Marchés Publics a été promulgué (Décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011) pour des soucis d'efficacité et d'efficience ;
-  Et la généralisation des revues indépendantes de la conformité de la passation des marchés des Autorités Contractantes sous l'impulsion de la nouvelle Autorité de Régulation des Marchés.

La présente mission de revue indépendante s'inscrit donc dans le cadre de la généralisation précitée.

## 1.1.2 Modalités d'intervention

### 1.1.2.1 Audit de la passation

Dans le cadre de l'audit de la passation des marchés, nous avons effectué les tâches suivantes :

- ✚ en début de mission, sélectionner et valider un échantillon représentatif en type de contrat, taille et mode de passation des marchés ; **l'échantillon est composé comme suit :**

Modes de passation des marchés	Récapitulatif des marchés passés au titre de la gestion 2011		Échantillon des marchés examinés lors de la présente revue		%	
	Nbre	Montant	Nbre	Montant	Nbre	Montant
Appel d'Offres Ouvert (AOO)	17	14 263 246 308	14	14 134 376 208	82,24%	99,10%
Appel d'Offres Restreint (AOR)						
Prestations Intellectuelles (PI)	05	1 056 947 084	1	27 494 000	20%	2,60%
Demande de Renseignements et de Prix (DRP)	08	103 886 501	08	103 886 501	100%	100%
Entente Directe (ED)						
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>15 424 079 893</b>	<b>23</b>	<b>14 265 756 709</b>	<b>76,66%</b>	<b>92%</b>

- ✚ vérifier les procédures de passation des marchés sur cet échantillon (publicité préalable, dossier de consultations, validité de la méthode de passation choisie, couverture budgétaire, rapports d'évaluation des offres, traitement des plaintes, délais de passation, délais de publication des attributions, contenu des contrats signés avec les titulaires des marchés, délais des paiements, respect des délais d'exécution, respect des procédures de réception, etc.) ; à chaque fois que cela est applicable, examiner la conformité des avis de la DCMP avec la réglementation ;
- ✚ examiner et analyser le respect de certaines dispositions particulièrement importantes du CMP telles que, l'inscription préalable des marchés dans les plans et avis généraux de passation de marchés, l'attribution aux moins disants qualifiés, le non fractionnement de marchés, les conditions préalables de mise en concurrence, les réponses aux demandes d'éclaircissement demandées par les candidats, l'approbation des marchés par les autorités compétentes, les éléments constitutifs des cahiers des charges, les seuils des avenants, le respect des délais d'exécution, les cas de résiliation, etc. ;

- ✚ établir des statistiques sur les marchés ; procéder, en particulier, à une analyse comparative de l'utilisation de méthodes non ou peu compétitives (ententes directes, appels d'offres restreints, avenants, DRP) ;
- ✚ analyser l'organisation en général **et les structures (hommes, procédures, système de suivi et de contrôle, ....) intervenant dans le processus de passation et d'exécution des marchés en particulier ; diagnostic approfondi des cellules des marchés ;**
- ✚ **faire des vérifications sur :**
  - l'enregistrement des contrats à la charge des titulaires,
  - la production des cautions d'avance de démarrage et de bonne exécution,
  - l'émission des ordres de service s'agissant des travaux,
  - la réception par les commissions ad-hoc des travaux et fournitures,
  - la mise à jour du manuel des procédures de marchés et DRP s'agissant des Etablissements Publics, Agences et SPPM,
  - la tenue des registres de marchés côtés et paraphés, mis à jour,
  - l'application des pénalités de retard prévues ;
- ✚ examiner globalement la qualité, la transparence et l'efficacité des opérations de passation des marchés de l'autorité contractante, de même que son organisation institutionnelle pour la gestion des marchés ;
- ✚ vérifier le niveau d'application des recommandations émises par les audits antérieurs ;
- ✚ formuler des recommandations pour une meilleure application du CMP ;
- ✚ demander à l'autorité contractante tous les documents pouvant nous permettre de contrôler l'exhaustivité et l'exactitude des informations communiquées (états d'exécution budgétaire, balances auxiliaires des comptes fournisseurs, extraits de grands livres....) ;
- ✚ procéder aux recoupements et confirmations d'information des autorités contractantes par rapport à d'autres sources telles que la DCMP, etc. ;
- ✚ organiser des séances de restitution de notre rapport provisoire au niveau de chacune des autorités contractantes concernées.



### **1.1.2.2 Audit de l'exécution physique**

Les marchés de la SAED ne figurent pas dans l'échantillon devant faire l'objet de contrôles physiques validé par l'ARMP.

## **1.2 Constats relatifs au dispositif des marchés publics**

Concernant le dispositif des marchés publics au titre de la gestion 2011, nous avons relevé les points suivants au niveau de :

### **▪ la Commission des Marchés Publics**

Nous avons relevé :

- un retard dans la mise en place de la Commission des Marchés de la SAED. La commission des Marchés a été mise en place le 06 janvier 2011 alors que les copies des actes de nomination des membres des commissions et de leurs suppléants doivent être communiquées à l'ARMP et à la DCMP avant le 05 janvier de l'année conformément à l'arrêté « **N° 011588 pris en application de l'article 36-1 du Code des Marchés publics et fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes** » ;
- que les attestations de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics ont été signées par les membres de la Commission pour la plus part le 03/08/2011, alors qu'elles doivent être signées avant le démarrage de leurs activités;
- l'absence de courrier de transmission matérialisant l'envoi des copies des actes de déclaration de la charte de transparence signées à l'ARMP et à la DCMP.

### **▪ la Cellule de Passation des Marchés Publics**

Nous avons relevé :

- que les rapports trimestriels ont été produits toutefois, nous n'avons pas obtenu le courrier de transmission de ces rapports à la DCMP et à l'ARMP conformément à l'arrêté N°011586 du 28/12/2007 pris en application de l'article 35 du CMP relatif aux CPM des Autorités Contractantes ;
- le manuel des procédures de la SAED n'est pas mis à jour, au regard du Code des Marchés en vigueur ;

## **1.3 Constats de l'audit**

### **1.3.1 Échantillons**


Dans le cadre de nos travaux d'audit, nous avons reçu la liste des marchés passés en 2011 par la Société Nationale d'Aménagement des terres du Delta et de la Vallée du Fleuve Sénégal. (SAED). Cette liste est constituée de 30 marchés dont 22 Appels d'Offres (y compris les prestations intellectuelles) et de 08 Demandes de Renseignement et de Prix (DRP).

Nous avons examiné l'ensemble de la liste obtenue.

Nous avons retenu un échantillon qui comprend :

- 15 Appels d'Offres dont (01) prestation Intellectuelle pour un montant total de 14 161 870 208 FCFA ;
- 08 Demandes de Renseignement et de Prix (100% des DRP) pour un montant total de 103 886 501 FCFA.

Le graphe ci-dessous indique la **répartition par nature** des marchés de l'échantillon

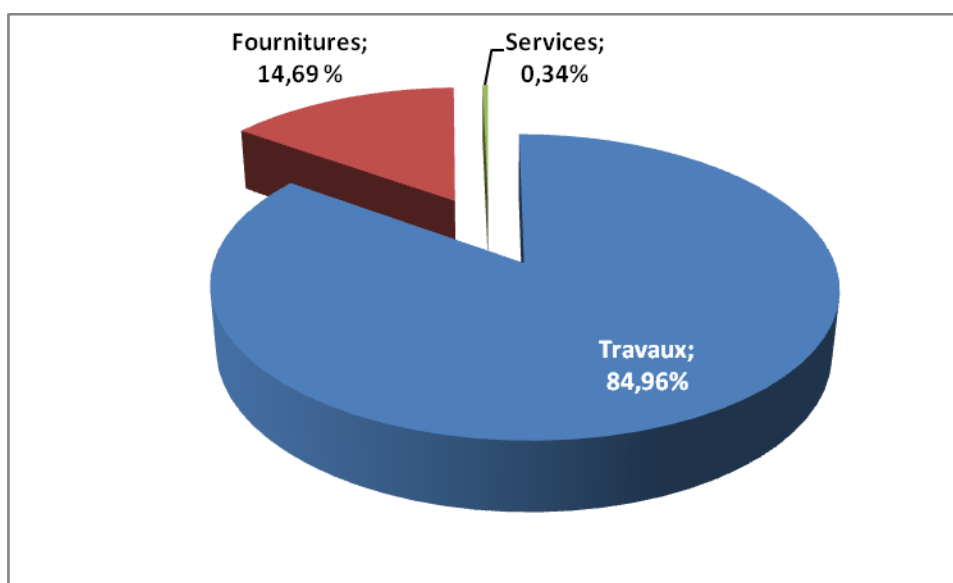

L'échantillon est constitué de :

- 84,96% de travaux pour un montant de 12 120 377 317 FCFA
- 14,69% de fournitures pour un montant de 2 096 200 332 FCFA
- 0,34% de services pour un montant de 49 179 060 FCFA

### 1.3.2 Constats généraux relatifs à la passation et à l'exécution des marchés

Nous avons relevé les constats généraux ci-dessous :

#### Sur les Appels d'Offres :

- Absence de publication définitive de certains marchés.

### Sur les Demandes de Renseignement et de Prix (DRP)

- ✚ Les lettres d'invitation adressées aux candidats ne sont pas déchargées par ces derniers. Nous ne disposons pas non plus, du cahier de transmission desdites lettres. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la réception effective des lettres d'invitation par les candidats consultés.
- ✚ Les DRP passées par la SAED en 2011 ne sont pas accompagnées des éléments ci-après comme le stipule la circulaire de mise en œuvre de la DRP N°0004/PM/CAB/CP:
  - 1 formulaire de soumission ;
  - 2 projet de contrat ;
  - 3 bordereau de prix.

### 1.3.3 Constats spécifiques relatifs à la passation des marchés

Nous avons relevé les constats spécifiques suivants

#### Sur les Appels d'Offres Ouverts (AOO)

Nous n'avons pas obtenu la publication définitive des marchés :

- ✚ Fourniture, livraison et installation des équipements électromécaniques et électriques d'un montant de 1 010 389 697 HT/HD attribué à EIFFAGE/Sénégal ;
- ✚ Travaux de terrassement et de génie civil pour l'aménagement des réseaux secondaires d'alimentation et de drainage ainsi que des pistes de desserte de 2500ha d'irrigation dans la zone du Gorom d'un montant de 5 186 693 990 TTC attribué à RC Construction.

#### Demande de Renseignement et de Prix (DRP)

Nous n'avons pas obtenu la lettre informant le soumissionnaire **RC PORTUGAFRIQUE** du rejet de son offre pour la DRP « **Travaux de maintenance des périmètres irrigués** » d'un montant de 31 122 500 TTC.

Des pénalités de retard ne sont pas prévues dans les contrats des DRP « **Travaux de maintenance des périmètres irrigués** » et « **Formation d'un (01) agent de la SAED sur Oracle version 10g et sur l'administration de Windows 2008 Serveur** » d'un montant de 5 310 000 TTC.

### 1.3.4 Constats spécifiques relatifs à l'exécution financière

Nous n'avons pas relevé d'anomalies majeures concernant l'exécution financière des marchés passés par la SAED 2011.

## 1.4 Recommandations

N°	Constats	Nombre de constats %	Recommandations	Commentaires de la SAED
<b>A00</b>				
1	<p>Nous n'avons pas obtenu la publication définitive des marchés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fourniture, livraison et installation des équipements électromécaniques et électriques</li> <li>• Travaux de terrassement et de génie civil pour l'aménagement des réseaux secondaires d'alimentation et de drainage ainsi que des pistes de desserte de 2500ha d'irrigation dans la zone du Gorom</li> </ul>	13%	Nous recommandons à la SAED de procéder à la publication définitive des marchés passés conformément au CMP.	<p><i>La SAED a passé durant l'exercice 2011, vingt-deux (22) marchés. Tous les avis d'attribution provisoires ont été publiés.</i></p> <p><i>Pour les avis d'attribution définitive seuls vingt ont été retrouvés, soit 91% du total. Les deux restants ont certainement été publiés.</i></p> <p><i>Dans tous les cas, nous veillerons au classement de tous les avis.</i></p>

N°	Constats	Nombre de constats %	Recommandations	Commentaires de la SAED
<b>DRP</b>				
1	Les lettres d'invitation adressées aux candidats ne sont pas déchargées par ces derniers. Nous ne disposons non plus, du cahier de transmission desdites lettres. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la réception effective des lettres d'invitation par les candidats.	92%	Nous recommandons à la SAED, pour le lancement des DRP de contacter cinq (05) fournisseurs au moins conformément à la circulaire N°0004/PM/CAB/CP de mise en œuvre des DRP et à l'article 78 du CMP, par lettre d'invitation. De faire décharger ces lettres par les destinataires ou de tenir un registre de transmission.	<p>Conformément à l'article 78 du code des marchés, la SAED sollicite simultanément, par écrit des prix auprès d'au moins cinq entreprises.</p> <p>Les lettres d'invitation sont envoyées par voie postale. Dans chaque courrier nous précisons à son destinataire de confirmer qu'il a reçu la lettre et qu'il présentera une offre.</p> <p>En outre, nous téléphonons pour nous assurer de la réception du courrier et nous leur disons de nous notifier qu'ils ont reçu la lettre.</p> <p>Malheureusement, ils ne répondent pas. En général, ce sont les cabinets extérieurs qui accusent réception.</p> <p>Néanmoins, le fait que ces entreprises déposent leurs offres dans les délais requis est une preuve qu'elles ont bien reçu les invitations.</p> <p>Aussi, nous vous faisons remarquer que le cahier de transmission sur lequel le destinataire appose sa signature (décharge) pour matérialiser qu'il a reçu est faisable si les entreprises concernées étaient basées à Saint-Louis ou dans les environs. Malheureusement, tel n'est pas le cas.</p> <p>Par contre, notre bureau du courrier enregistre toutes les lettres transmises par voie postale.</p>
2	Les DRP passées par la SAED en 2011 ne sont pas accompagnées des éléments ci-après comme le stipule la circulaire de mise en œuvre de la DRP N°0004/PM/CAB/CP: <ul style="list-style-type: none"> <li>• formulaire de soumission</li> <li>• projet de contrat</li> <li>• bordereau de prix</li> </ul>	100%	Nous recommandons à la SAED de faire accompagner les lettres d'invitation de toutes les pièces et mentions nécessaires conformément à la circulaire N°0004/PM/CAB/CP de mise en œuvre des DRP	<p>Les DRP passées par la SAED sont accompagnées d'un bordereau de prix (sans ce bordereau le fournisseur ne peut pas préparer son offre).</p> <p>Pour le formulaire de soumission et le projet de contrat nous en prenons acte. Dans les prochaines consultations, nous les intégrerons dans le cahier de charges.</p>

N°	Constats	Nombre de constats %	Recommandations	Commentaires de la SAED
3	Nous n'avons pas obtenu la lettre informant le soumissionnaire RC PORTUGAFRIQUE du rejet de son offre pour la DRP « <b>Travaux de maintenance des périmètres irrigués</b> » d'un montant de 31 122 500 TTC.	12,5%	Nous recommandons à la SAED d'informer tous les candidats non retenus du rejet de leur offre par lettre contre décharge.	<i>La SAED, conformément au code informe les candidats non retenus du rejet de leur offre comme vous avez eu à le constater dans votre revue de conformité.</i>  <i>Pour cette DRP, il s'agit certainement d'une omission. A l'avenir nous corrigerons ce manquement.</i>
4	Des pénalités de retard ne sont pas prévues dans les contrats des DRP « <b>Travaux de maintenance des périmètres irrigués</b> » et « <b>Formation d'un (01) agent de la SAED sur Oracle version 10g et sur l'administration de Windows 2008 Serveur</b> » d'un montant de 5 310 000 TTC.	25%	Nous recommandons à la SAED de prévoir dans les contrats des clauses de pénalité de retard.	<i>Des pénalités de retard ne sont pas mises dans ces contrats relatifs aux DRP, contrairement aux marchés où, c'est une obligation.</i>  <i>Nous pensions qu'à ce niveau, c'est encore une procédure allégée, c'est pourquoi, il n'existe pas de modèle type pour ce mode de passation.</i>  <i>Il appartient à l'AC d'adapter son contrat en fonction de son importance et de sa consistance, et que cette clause ne fait pas partie des mentions obligatoires pour ces types de contrats.</i>  <i>Néanmoins, à l'avenir, nous veillerons à ce que cette clause soit intégrée.</i>

N°	Constats	Nombre de constats %	Recommandations	Commentaires de la SAED
<b>Organisation</b>				
1	Nous avons relevé un retard dans la mise en place de la Commission des Marchés de la SAED. La commission des Marchés a été mise en place le 06 janvier 2011 alors que les copies des actes de nomination des membres des commissions et de leurs suppléants doivent être communiquées à l'ARMP et à la DCMP avant le 05 janvier de l'année conformément à l'arrêté « N° 011588 pris en application de l'article 36-1 du Code des Marchés publics et fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes » ;	N/A	Nous recommandons à la SAED de mettre en place sa Commission des Marchés Publics et de transmettre les copies des actes de nomination avant le 05 janvier de l'année.	<i>A l'avenir, nous veillerons à prendre les dispositions nécessaires.</i>
2	Les attestations de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics ont été signées par les membres de la Commission pour la plus part le 03/08/2011, alors qu'elles doivent être signées avant le démarrage de leurs activités;	N/A	Nous recommandons à la SAED de faire signer à toutes les personnes impliquées dans le processus de passation et d'exécution des marchés les attestations de prise de connaissance de la charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics conformément à l'arrêté N°011588 du 28/12/2007 pris en application de l'article 36-1 du Code des Marchés publics et fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes.	<i>A l'avenir, nous veillerons à prendre les dispositions nécessaires pour éviter ce retard.</i>

N°	Constats	Nombre de constats %	Recommandations	Commentaires de la SAED
3	Nous n'avons pas obtenu le courrier de transmission matérialisant l'envoi des copies des actes de déclaration de la charte d'éthique et de transparence en matière de marchés publics signées à l'ARMP et à la DCMP	N/A	Nous recommandons à la SAED de transmettre les copies des actes de déclaration de la charte d'éthique et de transparence en matière de marchés publics à l'ARMP et à la DCMP conformément à l'arrêté N°011588 du 28/12/2007 pris en application de l'article 36-1 du Code des Marchés publics et fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes.	<i>Les copies des actes de déclaration de la charte sont envoyées chaque année à l'ARMP et à la DCMP par voie officielle conformément à l'arrêté N° 012786 du 26 Décembre 2012. et sont enregistrées par notre bureau du courrier.</i>
4	Les rapports trimestriels ont été produits toutefois, nous n'avons pas obtenu le courrier de transmission de ces rapports à la DCMP et à l'ARMP conformément à l'arrêté N°011586 du 28/12/2007 pris en application de l'article 35 du CMP relatif aux CPM des Autorités Contractantes.	N/A	Nous recommandons à la SAED de transmettre les rapports trimestriels produits à la DCMP et à l'ARMP tout en assurant une matérialisation de cette transmission.	<i>Les rapports trimestriels sont transmis à l'ARMP et à la DCMP par voie officielle et sont enregistrés par notre bureau du courrier.</i>
5	Le manuel des procédures de la SAED n'est pas à jour, au regard du Code des Marchés en vigueur ;	N/A	Nous recommandons à la SAED de mettre à jour son manuel de procédures en conformité au CMP en vigueur.	<i>Le manuel sera mis à jour durant l'exercice 2013.</i>



## 1.5 Suivi des recommandations de la revue de 2010

N°	Constats	Recommandations	Niveau d'application des recommandations
1	Dans sa section portant sur l'examen préliminaire des offres, la Commission Technique indique que « après vérification des pièces exigées dans le dossier de DP, la soumission d'Innov'Actions s'est révélée complète et donc recevable ». En dehors de cette assertion, aucun contrôle, formalisé du dépôt des pièces administratives requises aux termes des articles 43 et 45 du CMP n'est matérialisé dans le rapport d'évaluation	Veiller à la formalisation du contrôle du respect par les candidats des conditions d'accès à la commande publique telles que spécifiées dans les articles 43 et 45 du CMP ;	Appliqué
2	L'offre financière du seul candidat a été ouverte le 27 août 2010. Le montant de l'offre ayant dépassé les 30 millions, il a été demandé au prestataire par lettre en date du 30 août, de revoir son offre à la baisse ce qu'il a accepté de faire. Il s'agit d'une mauvaise application de l'article 79 du CMP. Même si l'article 79 du CMP indique bien que « le marché peut ensuite faire l'objet de négociations avec le candidat dont la proposition est retenue », lesdites négociations doivent donner lieu à la rédaction d'un procès verbal signé par les deux parties. Par ailleurs, l'examen des deux offres financières a permis de noter qu'il s'agit d'une réduction forfaitaire non basée sur la diminution du volume d'heures d'intervention. Il faut préciser que si la négociation est possible, elle doit porter sur des modifications techniques susceptibles d'impacter l'offre financière ; elle ne doit pas porter sur des prix unitaires mais plutôt sur le nombre des intervenants et les temps d'interventions.	Veiller à conduire les négociations conformément aux règles applicables en la matière	Appliqué
3	Le contrat n'a pas prévu l'application éventuelle de pénalités de retard en cas de non respect des délais contractuels.	Veiller au respect des dispositions de l'article 13 du CMP relatif aux mentions obligatoires à insérer dans les contrats	Partiellement appliqué
4	Le marché a été approuvé le 26 mai 2010, notifié à l'attributaire le 27 mai 2010 antérieurement à l'avis de non objection du bailleur sur le projet de contrat qui a été délivré le 4 juin 2010. Sous ce rapport, il convient de noter que la SAED a demandé l'avis de non objection de l'AFD sur la liste retreinte tout comme sur la DP avant de faire ces mêmes demandes à la DCMP.	Veiller à mieux maîtriser les délais de mise en œuvre des procédures de passation des marchés	Appliqué
5	La garantie de soumission fournie par ESIES pour le lot 1, établie le 22 mars 2010 n'est pas valide car sa date d'expiration était fixé au 22 juin 2010, n'atteignant pas ainsi sa durée de validité mentionnée dans le DAO (120 jours après la date de dépôt des offres). Cette même attestation de garantie de soumission précise dans son contenu qu'elle expire 30 jours après celle de la durée de validité des offres (informations contradictoires). En conséquence, l'offre d'ESIES n'aurait pas dû être acceptée pour examen détaillé	Veiller à la cohérence des informations contenues dans les différents documents de passation des marchés	Appliqué

N°	Constats	Recommandations	Niveau d'application des recommandations
6	L'avis d'appel d'offres n'indique pas les durées de validité des offres et des garanties de soumission ; il ne donne pas non plus les critères généraux de qualification	Indiquer dans les AAO les durées de validité des offres et des garanties de soumission ; y indiquer les critères généraux de qualification et renvoyer au DAO pour le détail desdits critères	Appliqué
7	Il est noté dans l'AAO que la durée de validité des offres est de 90 jours et que la garantie de soumission est également valable 90 jours à compter de la date de dépôt des offres. Il convient de rappeler que l'expiration de la durée de validité des garanties de soumission doit intervenir 30 jours après celle de la période de validité des offres	Veiller à se conformer au CMP pour la détermination des périodes de validité des offres et des garanties de soumission	Appliqué
8	Les lettres d'information aux candidats non retenus ne sont pas jointes au dossier.	Veiller au classement et à l'archivage exhaustif des dossiers de marchés	Non appliqué
9	Les lettres d'invitation à soumissionner ne portent pas d'accusé de réception des destinataires, attestant la transmission effective de ces dites lettres	Se conformer aux dispositions de la circulaire 004 du PM sur la mise en œuvre de la procédure de DRP	Non appliqué

### **Observations sur le suivi des recommandations de la revue de 2010**

« Vous dites que ces recommandations :

- sont Partiellement appliquées pour l'insertion dans les contrats, des pénalités de retard en cas de non-respect des délais contractuels ;
- ne sont pas appliquées pour les lettres d'information aux candidats non retenus (nous rappelons que cette remarque est valable pour un seul candidat RC PORTUGAFRIQUE) et pour les accusés de réception relatifs aux DRP.

Nous vous rappelons que cette revue de 2010 a été réalisée en **Avril 2012**, par conséquent, ces recommandations ne peuvent être appliquées pour la revue de 2011 ».

## 2. DISPOSITIF ET METHODOLOGIE DE L'AUDIT

### 2.1 Rappel des termes de références

#### 2.1.1 Contexte de la mission

Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flux considérable de transactions qu'elle génère et désireux de promouvoir la transparence, l'efficacité et la responsabilisation, essentielles à une bonne gouvernance, dans un État de droit, le Gouvernement du Sénégal a procédé à une profonde réforme de son système de passation de marchés publics. Cette réforme aligne le système sénégalais sur les meilleures pratiques internationales en la matière, notamment en transposant les directives de l'UEMOA relatives à l'harmonisation des marchés publics des États membres de l'Union. Elle comporte d'importantes innovations par rapport à la réglementation antérieure en ce qu'elle consacre la régulation, institue le recours suspensif des soumissionnaires au stade de passation de marchés, rationalise le contrôle à priori, supprime définitivement les régimes dérogatoires, responsabilise davantage les ministères et organismes dépensiers et systématise le contrôle à posteriori.

Au plan institutionnel, la réforme a contribué à la création de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) sous forme d'autorité administrative indépendante, distincte du service administratif chargé du contrôle à priori de la passation des marchés, en l'occurrence la Direction Centrale des Marchés publics (DCMP).

Les missions de l'ARMP, autorité administrative indépendante dotée de l'autonomie financière, s'organisent autour du principe qui vise à séparer les fonctions de contrôle des marchés publics (conférées à la DCMP) des fonctions de régulation qui lui permettent d'intervenir sur l'ensemble du secteur, tant à travers des missions d'assistance dans l'élaboration des politiques ou de la conception d'outils de passation (documents et formulaires standards...), qu'en matière de formation ou de développement du cadre professionnel en plus des fonctions mêmes qui constituent le cœur de la régulation, l'audit et le règlement des conflits.

En particulier, l'ARMP est tenue de faire réaliser, **à la fin de chaque gestion budgétaire**, un audit indépendant en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, d'exécution et de contrôle des marchés et conventions.

La présente mission concerne la mise en œuvre d'une revue indépendante pour la vérification, et, en référence au Code des Marchés publics (CMP), de la transparence et des conditions de régularité des procédures d'élaboration, de passation et d'exécution des marchés publics, des avenants et marchés complémentaires conclus au titre de l'exercice 2011 par les autorités contractantes indiquées à l'annexe 1 des termes de référence.

## 2.1.2 Objectifs de la mission







### 2.1.2.1 Objectif principal

La mission a pour **objectif principal**, au sein des autorités contractantes du Groupe 1, de vérifier le processus de passation et d'exécution des marchés conclus entre le 1<sup>er</sup> Janvier et le 31 décembre 2011, afin de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures édictées par le Code des Marchés Publics.

Il s'agit principalement d'apprécier l'adéquation des procédures de passation des marchés et les modalités de gestion des contrats aux dispositions du CMP pour les dépenses effectuées par lesdites autorités contractantes.

### 2.1.2.2 Objectifs spécifiques

La mission comprend **les objectifs spécifiques** suivants :

-  se faire une opinion sur les procédures de passation de marchés adoptées pour les contrats sélectionnés ; **l'opinion doit être fournie individuellement pour chaque autorité contractante** ;
-  vérifier la conformité des procédures aux principes généraux d'économie, efficacité, équité et transparence, édictés par le CMP ;
-  fournir autant que possible, une opinion sur la qualité des contrats, incluant les aspects techniques et économiques ;
-  identifier les cas de non-conformité des procédures avec les directives du CMP, en particulier dans les cas de rejet d'offres moins - disantes, de fractionnement de marchés, de non respect des dispositions préalables à la mise en concurrence, de non respect des éléments constitutifs des cahiers des charges, de non respect des seuils fixés pour les avenants, de non respect des règles de publicité et de communication, etc. ; pour chacune des autorités contractantes, nous apporterons un jugement sur l'acceptabilité de telles situations en regard des dispositions du CMP ;
-  procéder à la revue des plaintes des soumissionnaires pour évaluer l'exhaustivité, l'efficacité et la pertinence de leur traitement par l'autorité contractante et établir le pourcentage des plaintes traitées en conformité avec la réglementation en vigueur ; en ce qui concerne les plaintes finalement soumises au Comité de Règlement des Différends de l'ARMP, nous examinerons également le degré d'application (en pourcentage), par l'autorité contractante, des décisions y relatives, de même que la pertinence de ces décisions ;
-  pour les marchés sélectionnés atteignant les seuils de revue de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP), examiner la pertinence et la conformité à la réglementation des avis de cette direction ;

- ✚ dégager pour les contrats sélectionnés, les niveaux effectifs de décaissement par rapport au niveau d'exécution ;
- ✚ examiner et évaluer les situations d'attribution de marchés par entente directe en passant en revue l'ensemble des marchés passés par ce système afin d'en déduire d'une part, les pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré à gré par rapport à l'ensemble des marchés passés par l'autorité contractante et, d'autre part, les pourcentages en montant et en nombre des marchés de gré à gré non conformes à la réglementation en vigueur ; nous évaluerons aussi dans toute la mesure du possible la compétitivité des prix proposés dans les marchés par entente directe ;
- ✚ examiner la conformité de l'organisation en matière de passation de marchés et, fournir, au regard des dispositions prévues par le CMP et ses textes d'application, des recommandations sur le fonctionnement et les capacités des commissions internes de marchés, des cellules de passation de marchés et des différents contrôles internes ;
- ✚ examiner les éventuels indices de fraude et de corruption ou d'autres pratiques (manœuvres collusoires, manœuvres restrictives, manœuvres obstructives) telles qu'elles sont définies dans les Directives publiées par la Banque Mondiale ;
- ✚ évaluer éventuellement le niveau de prise en compte des recommandations de l'audit précédent et leur application par l'Autorité contractante, ainsi que l'impact éventuel de ces mesures sur les pratiques au niveau de cette autorité ;
- ✚ exprimer nos recommandations pour le futur.

En fin de mission nous assurerons à cinq (5) à sept (7) experts de l'ARMP et cinq (5) à sept (7) experts de la Direction Centrale des Marchés Publics DCMP, une formation de deux (2) jours sur les pratiques d'audit en matière de passation de marchés. Les sessions de formation seront organisées au siège de l'une desdites institutions.

### **2.1.3 Périmètre de la mission**

Notre mission porte principalement sur :

- ✚ la vérification, au sein des autorités contractantes indiquées à l'annexe 1 des TDR (pour les ministères sont pris en compte, outre les services centraux, les organismes rattachés, soumis à l'application du CMP, indiqués à l'annexe 1), de l'application des dispositions du CMP dans le cadre de la passation et de l'exécution des marchés quelle que soit la source de financement (ressources internes et ressources externes) leurs budgets (budget de l'Etat pour les services centraux des ministères ; budget des organismes rattachés aux ministères, soumis à l'application du CMP ; budget des collectivités locales) ;
- ✚ la formulation de recommandations tant au niveau organisationnel qu'au niveau de la passation et de l'exécution des marchés ;

- ✚ l'organisation des séances de restitution de nos rapports provisoires au niveau de chacune des autorités contractantes concernées ;
- ✚ en fin de mission, la formation sur les pratiques d'audit en matière de passation de marchés au bénéfice de cinq (05) à sept (7) experts de l'ARMP et cinq (05) à sept (7) experts de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP). Les sessions de formation seront organisées au siège de l'une desdites institutions pour une durée de deux (02) jours.

## **2.2 Méthodologie de mise en œuvre**

### **2.2.1 Approche contradictoire**

Ce type de mission requiert la pleine collaboration des Autorités Contractantes (AC). A ce titre, il a été planifié une réunion de démarrage de la mission avec chaque Autorité Contractante. Au cours de ces réunions, notre équipe :

- ✚ s'est assurée que chaque Autorité Contractante disposait bien des termes de référence de la mission ;
- ✚ a rappelé le périmètre de la mission et ses nouveautés par rapport à la revue de l'année précédente, avec notamment le contrôle d'exécution physique et le rapprochement avec l'exécution budgétaire ;
- ✚ a insisté sur le partage préalable des résultats de la revue avant la production du rapport provisoire ;
- ✚ a confirmé avec l'AC, le calendrier des travaux de terrain et les conditions logistiques y afférentes.
- ✚ a demandé les documents suivants :
  - Organisation/Organigramme
  - Plan de Passation des Marchés ;
  - Liste des marchés passés ;
  - Balance générale des comptes ou état d'exécution budgétaire détaillé de 2011 ;
  - Grand livres des comptes et tableau de passation 2011 ;
  - Cycle passation et organisation du manuel des procédures en vigueur ;
  - Note éventuelle sur l'évolution institutionnelle de l'AC ou les rapports d'activités transmis à l'ARMP le cas échéant ;
  - Composition de la Commission des marchés / correspondance de transmission aux organes ad hoc ;
  - Composition de la Cellule de Passation des marchés / correspondance de transmission aux organes ad-hoc ;
  - Attestations de prise de connaissance de la charte d'éthique et de transparence.

## 2.2.2 Synthèse des phases et étapes de notre intervention

Notre intervention comprend **cinq (05) phases** clés tenant compte des finalités poursuivies par la mission. Ces cinq (05) phases clés sont composées d'activités pouvant pour certaines d'entre elles, être simultanées.

1. **Cadrage général de la mission ;**
2. **Revue des marchés ;**
3. **Contrôle d'exécution physique ;**
4. **Rapports et restitutions aux AC ;**
5. **Formation.**

PHASE	INTITULE DE LA PHASE	N° ACTIVITE	INTITULE ACTIVITE
<b>1</b>	<b>CADRAGE GENERAL DE LA MISSION</b>		
		1.1	Confirmation de notre démarche avec l' ARMP
		1.2	Contact des Responsables des Cellules de Passation de Marchés de chaque Autorité Contractante et obtention des listes de marchés et DRP
		1.3	Détermination des échantillonnages
<b>2</b>	<b>REVUE DES MARCHES</b>		
		2.1	Prise de connaissance des Autorités Contractantes et revue de leur organisation
		2.2	Analyse des pratiques courantes et revue du système de contrôle interne
		2.3	Travaux d'audit
<b>3</b>	<b>CONTROLE D'EXECUTION PHYSIQUE</b>		
		3.1	Confirmation des marchés à contrôler et planification
		3.2	Travaux de contrôle d'exécution physique
		3.3	Rapport de contrôle d'exécution physique
<b>4</b>	<b>RAPPORTS ET RESTITUTIONS AUX AC</b>		
		4.1	Rapports
		4.2	Présentation des rapports provisoires
		4.3	Ajustements et production des rapports finaux de la phase d'audit du processus de passation et des rapports de synthèse
<b>5</b>	<b>FORMATION</b>		
		5.1	Programmation et conception des modules
		5.2	Délivrance de la formation et compte-rendu

## **2.3 Description des travaux d'audit**

### **2.3.1 Audit de la passation des marchés**





Dans le cadre de l'audit de la passation des marchés, nous avons effectué les travaux présentés ci-dessous :

#### **2.3.1.1 Revue des textes**





Nous avons fait, à l'entame de la mission, une prise de connaissance approfondie du cadre général de la passation des marchés publics, avec notamment une revue des textes législatifs et réglementaires en vigueur et de l'ensemble des référentiels de base applicables à la passation des marchés et à l'autorité contractante.

#### **2.3.1.2 Analyse de l'environnement de la passation des marchés**

Nous avons également effectué une revue succincte de l'organisation et du fonctionnement de la Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitation des terres du Delta et de la Vallée du Fleuve Sénégal pour apprécier sa capacité à mettre en œuvre de manière efficace les procédures de contrôle des opérations de passation des marchés par la mise en œuvre des modules d'analyse et d'évaluation ci - après :

-  analyse de l'organisation institutionnelle mise en place en application des dispositions de l'article 35 du CMP (CM, CPM), des systèmes de gestion financière et des procédures de contrôle interne pour apprécier son aptitude à gérer la commande publique ;
-  évaluation de la qualité des procédures de passation des marchés quant à leur conception et à leur correcte mise en œuvre ;
-  contrôle de la régularité des dépenses ;
-  revue de la conformité des actes de nomination des membres des Commissions des Marchés et des Cellules de Passation des Marchés.

#### **2.3.1.3 Vérification des différentes étapes de la passation des marchés.**

-  rapprochement du Plan de Passation des Marchés (PPM) obtenu de la SAED avec celui qui a été publié par la DCMP sur le portail des marchés publics ;
-  rapprochement de l'avis général de passation des marchés avec le plan de passation des marchés ;
-  rapprochement de l'état d'exécution du plan de passation des marchés avec les données statistiques consignées dans le portail des marchés publics ;
-  contrôle et rapprochement de l'état d'exécution du plan de passation des marchés avec les mouvements cumulés des comptes fournisseurs retracés dans la balance auxiliaire des comptes fournisseurs, les comptes de charges et d'immobilisation pour s'assurer de la réalité, de l'exactitude et de l'exhaustivité des marchés ;



- ✚ sélection, conformément aux termes de référence de la mission, d'un échantillon de marchés à contrôler sur la base de critères combinés liés au mode de passation, au montant et au type de marchés ;
- ✚ contrôle de la correcte mise en œuvre de toutes les étapes de la passation des marchés.

Ces contrôles ont porté sur les aspects relatifs à :

- ✚ la conformité du mode de passation utilisé au regard des seuils de passation ;
- ✚ au respect des règles en matière de revue préalable, par la DCMP, des dossiers d'appel à la concurrence, des rapports d'évaluation ou des contrats ;
- ✚ au respect des règles de publicité et / ou de sélection des soumissionnaires potentiels ;
- ✚ au contenu des dossiers d'appel à candidatures ;
- ✚ au contenu des avis d'appel à candidatures et / ou invitations à soumissionner ;
- ✚ au respect des délais de préparation des offres ;
- ✚ au respect des délais de passation des marchés ;
- ✚ au contenu des procès verbaux d'ouverture des offres ;
- ✚ au contenu des rapports d'évaluation technique des offres ;
- ✚ au contenu des rapports d'évaluation financière des offres ;
- ✚ au contenu des procès verbaux d'attribution provisoire ;
- ✚ à l'existence d'une couverture budgétaire suffisante et préalable ;
- ✚ au contenu des lettres de notification ;
- ✚ à la publicité des attributions provisoires et / ou définitives et au contenu des avis ;
- ✚ à l'information des soumissionnaires non retenus ;
- ✚ au respect des délais d'exécution des marchés ;
- ✚ à la réception effective des biens et services.

### **2.3.2 Audit de l'exécution financière des marchés**

Nos travaux ont consisté essentiellement à vérifier :

- ✚ le règlement de la TVA avec vérification de reversement des précomptes au Trésor ;
- ✚ le respect de l'application des clauses de pénalités ;
- ✚ le contenu des contrats et le respect des dispositions relatives au paiement ;
- ✚ le recueil des garanties (garantie de soumission ou garantie de bonne exécution) ;
- ✚ la conformité aux modèles fournis dans les DAC et la durée de validité ;
- ✚ la vérification de l'habilitation par le MEF des organismes qui délivrent les garanties ;
- ✚ les paiements effectués en relation avec les clauses contractuelles.

### **2.3.3 Audit technique**

Les marchés de la SAED ne figurent pas dans l'échantillon devant faire l'objet de contrôle physique validé par l'ARMP.

## 2.4 Constitution de l'échantillon d'audit

### 2.4.1 Échantillon pour l'audit des aspects liés à la passation des marchés

#### 2.4.1.1 Description de l'échantillon


Dans le cadre de nos travaux d'audit, nous avons reçu la liste des marchés passés en 2011 par la Société Nationale d'Aménagement des terres du Delta et de la Vallée du Fleuve Sénégal (SAED). Cette liste est constituée de 30 marchés dont 22 Appels d'Offres (y compris les prestations intellectuelles) et de 08 Demandes de Renseignement et de Prix (DRP).

Nous avons examiné l'ensemble de la liste obtenue.

Nous avons retenu un échantillon qui comprend :

- 15 Appels d'Offres dont 01 prestation Intellectuelle pour un montant de 14 161 870 208 FCFA ;
- 08 Demandes de Renseignement et de Prix pour un montant total de 103 886 501 FCFA.

Le graphe ci-dessous indique la **répartition par nature** des marchés de l'échantillon

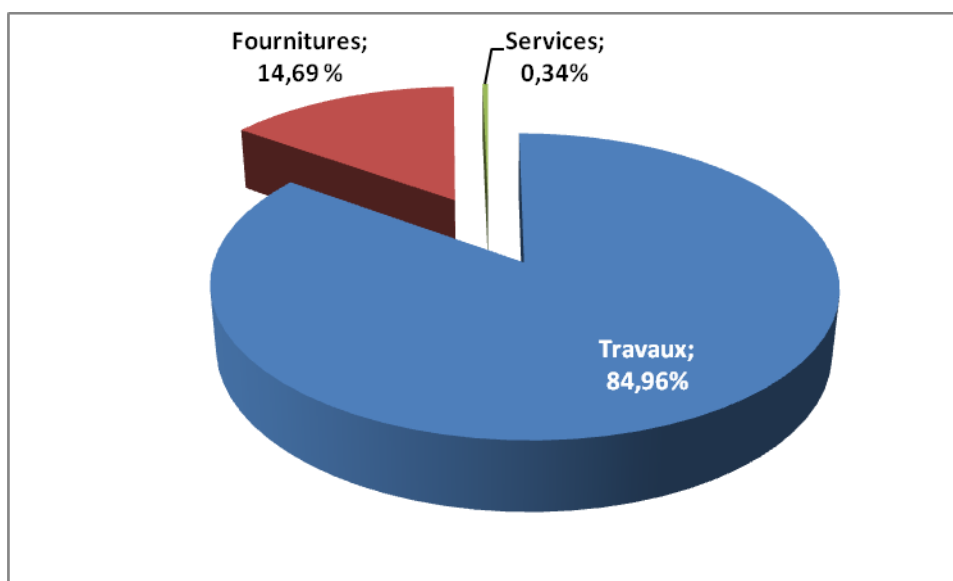

L'échantillon est constitué de :

- 84,96% de travaux pour un montant de 12 120 377 317 FCFA
- 14,69% de fournitures pour un montant de 2 096 200 332 FCFA
- 0,34% de services pour un montant de 49 179 060 FCFA

#### **2.4.1.2 Correction de l'échantillon**

L'échantillon sélectionné et validé en début de mission a été transmis à la SAED avant le début effectif de la mission.

#### **2.4.2 Échantillon pour l'audit technique**

Les marchés de la SAED ne figurent pas dans l'échantillon devant faire l'objet de contrôle physique validé par l'ARMP.

## **3. AUDIT DU SYSTEME DES MARCHES**




### **3.1 Rappels**

#### **3.1.1 Réglementation en vigueur pour l'exercice contrôlé**




##### **3.1.1.1 Rappel relatif à la réglementation des marchés publics au Sénégal**

Le Code des Marchés Publics (décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011) ;




Le Code des Marchés Publics (décret n° 545 du 25 avril 2007) ainsi que le Décret n° 2008-1165 portant modification du décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics (décret modifiant l'article 63) et le Décret n° 2010 – 1188 du 13 septembre 2010 modifiant et complétant le décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des marchés publics fixent les règles régissant la passation, l'exécution et le contrôle des marchés conclus par les autorités contractantes pour répondre à leurs besoins en matière de :

-  réalisation de travaux ;
-  d'achat de fournitures ;
-  d'achat de services ;

Le Code en vigueur a été pris en application :

-  de la Directive N° 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA);
-  de la Directive N° 05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ;
-  des dispositions relatives aux modes de conclusions des contrats administratifs du COA (Code des Obligations de l'Administration), qui résultent de la Loi n°65-51 du 19 juillet 1965, modifiée par la Loi n°2006-16 du 30 juin 2006. C'est ce que prévoit en particulier l'article 23 du COA.

Le contrôle des marchés publics est en outre fondé sur les textes suivants :

-  le décret n° 2005-576 du 22 juin 2005, portant Charte de Transparence et d'Éthique ;
-  le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007, portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
-  le décret n° 2007-547 du 25 avril 2007, portant création de la Direction Centrale des Marchés Publics ;

✚ les textes subséquents d'application parmi lesquels les arrêtés suivants :

- Arrêté N° 011580 du 28/12/07 pris en application de l'article 138 du Code des Marchés Publics fixant les seuils de contrôle a priori des dossiers de passation de marchés.
- Arrêté N° 011583 du 28/12/07 pris en application de l'article 111 du Code des Marchés Publics fixant les seuils en dessous desquels il n'est pas requis de garantie de soumission ;
- Arrêté N° 011584 du 28/12/07 pris en application de l'article 112 du Code des Marchés Publics fixant les seuils à partir desquels il est requis une garantie de bonne exécution ;
- Arrêté N° 011585 du 28/12/07 pris en application de l'article 77-3 du Code des Marchés Publics relatif aux commandes pouvant être dispensées de forme écrite et donner lieu à règlement sur mémoires ou factures ;
- Arrêté N° 011586 du 28/12/07 pris en application de l'article 35 du Code des Marchés Publics relatif aux Cellules de Passation des Marchés des Autorités Contractantes ;
- Arrêté N° 011587 du 28/12/07 pris en application de l'article 45-e du Code des Marchés Publics fixant le modèle d'engagement des candidats à respecter les dispositions de la Charte de Transparence et d'Éthique en matière de Marchés Publics ;
- Arrêté N° 011588 du 28/12/07 pris en application de l'article 36-1 du Code des Marchés Publics et fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des Autorités Contractantes ;
- Arrêté N° 03193 du 3/4/2010 pris en application de l'article 78 du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés Publics, relatif aux procédures applicables aux marchés passés par les communautés rurales et certaines communes ;

✚ Ainsi que les circulaires, décisions, résolutions, etc. précisant les modalités d'application du CMP.


### **3.1.1.2 Dispositif institutionnel actuel**

Le dispositif institutionnel mis en place comporte deux (02) nouvelles structures dont la création met fin à l'existence de la Commission Nationale des Contrats de l'Administration (CNCA) et du Bureau des Marchés du Ministère de l'Économie et des Finances :

- ✚ l'Autorité de Régulation des Marchés Publics – ARMP ;
- ✚ la Direction Centrale des Marchés Publics – DCMF ;

dont les rôles clés sont schématisés ci-après :

Figure 1 - Les acteurs institutionnels clés de la commande publique au Sénégal

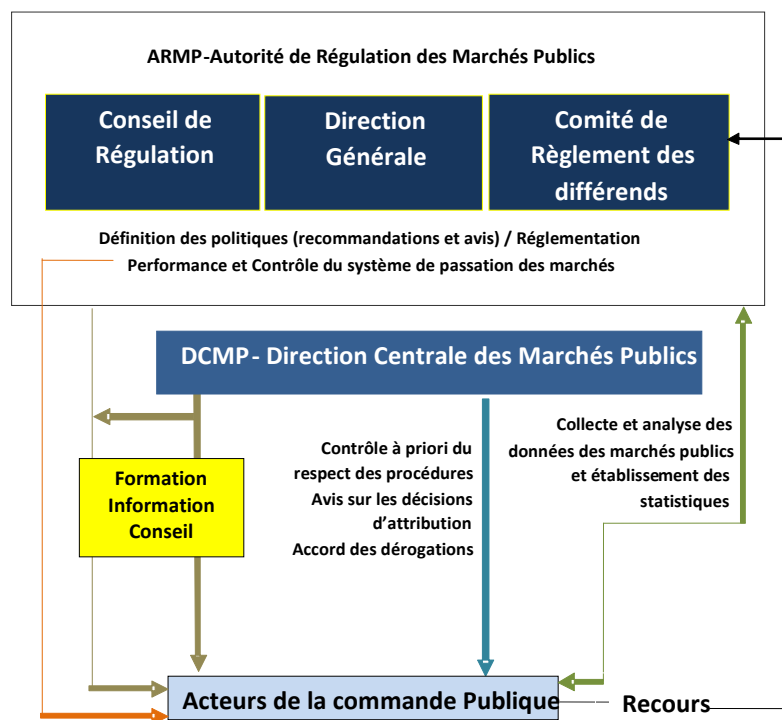

### 3.1.2 Principes

#### 3.1.2.1 Champ d'application du CMP

Le Code des Marchés Publics s'applique aux marchés conclus par les autorités contractantes suivantes :

1. l'État et les organismes non dotés de la personnalité morale placés sous son autorité ;
2. les collectivités locales, y compris les groupements mixtes et les établissements publics locaux visés respectivement par les articles 74 et 327 du Code des collectivités locales ;
3. les établissements publics ;
4. les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres que les établissements publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes à participation publique majoritaire, dont l'activité est financée majoritairement par l'État ou une collectivité locale et s'exerce essentiellement dans le cadre d'activités d'intérêt général ;




5. les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire ;
6. les associations formées par des personnes visées au point 1) à 4) du CMP.

Les marchés passés en application d'accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions du Code des Marchés Publics, sous réserve de l'application de dispositions contraires au code résultant des procédures prévues par lesdits accords ou traités internationaux.

Les marchés passés par une personne morale de droit public ou privé pour le compte d'une autorité contractante sont soumis aux règles qui s'appliquent, aux marchés passés directement par ladite autorité contractante. La délégation des tâches relatives à la passation de marchés concernant la réalisation d'ouvrages ou de projets doit être effectuée dans les conditions prévues par le CMP.

### **3.1.2.2 Durée des marchés (article 14 du CMP)**

La durée d'un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. Elle ne peut en principe être supérieure à un an sauf pour les marchés suivants :

-  les marchés à commandes et de clientèle, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du CMP ;
-  les marchés afférents à des programmes d'investissement et d'entretien de routes qui peuvent être contractés pour plusieurs années à la condition que les engagements qui en découlent demeurent respectivement dans les limites des autorisations de programme et des crédits de paiement contenus dans les lois de finances.
-  les marchés de gestion et d'entretien par niveau de services (GENIS) qui se fondent sur une obligation de résultats en lieu et place de l'obligation de moyens des marchés classiques ou les marchés pluriannuels d'entretien peuvent être contractés pour une durée allant jusqu'à sept ans.

### 3.1.2.3 Seuils de passation de marchés (article 53 du CMP)




Pour l'application des procédures de passation des marchés, il est tenu compte des seuils suivants relatifs à la valeur estimée des marchés, TVA comprises :

SEUILS DE PASSATION DE MARCHES en F CFA				
	État / Collectivités locales / Établissements publics	SN <sup>1</sup> / SA <sup>2</sup> à participation publique majoritaire	Agences et organismes	
			Dotés de la personnalité morale	Non dotés de la personnalité morale
Fournitures	15 000 000	30 000 000	30 000 000	15 000 000
Travaux	25 000 000	50 000 000	50 000 000	25 000 000
Prestations intellectuelles	25 000 000	30 000 000	30 000 000	25 000 000
Services	15 000 000	30 000 000	30 000 000	15 000 000

Les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils ci-dessus font l'objet de Demande de Renseignements et de Prix (DRP).

### 3.1.2.4 Contrôle à priori de la passation des marchés (arrêté n° 11580 pris en application de l'article 138 du CMP)

La Direction chargée du Contrôle des Marchés publics assure le contrôle à priori des procédures de passation de marchés. A ce titre elle :

-  émet un avis sur les dossiers d'appel à la concurrence avant le lancement de la procédure de passation concernant :
  - les marchés fractionnés quel que soit leur montant ;
  - les marchés que l'autorité contractante souhaite passer par appel d'offres restreint ou par entente directe ;
  - les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par l'arrêté n° 11580 du 28 décembre 2007 ;
  - les conventions de délégation de service public et les contrats de partenariat ;
  - les avenants aux marchés ci-dessus ou qui ont pour effet de porter le montant du marché au montant du seuil d'examen du dossier ;
-  émet un avis sur le rapport d'analyse comparative des offres ou propositions et sur le procès-verbal d'attribution provisoire du marché établis par la commission des marchés, relatifs aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par l'arrêté n° 11580 du 28 décembre 2007 ;
-  effectue un examen juridique et technique avant leur approbation des projets de marchés pour lesquels elle a indiqué souhaiter faire un tel contrôle lors de l'examen du dossier d'appel à la concurrence ou qui répondent aux conditions de nature et de montants fixés par l'arrêté n° 11580 du 28 décembre 2007.

<sup>1</sup> Sociétés Nationales

<sup>2</sup> Sociétés Anonymes








La Direction chargée du Contrôle des Marchés publics peut également donner un avis sur les dossiers que lui soumettent spontanément les autorités contractantes.



### **3.1.2.5 Signature des marchés (articles 27, 28 et 30 du CMP)**

La procédure de passation du marché est conduite par la personne responsable du marché qui est habilitée à signer le marché au nom de l'autorité contractante. Les marchés conclus par une personne non habilitée à cet effet sont nuls de nullité absolue.

Les personnes responsables des marchés chez les différentes autorités contractantes sont respectivement :


-  pour les marchés de l'Etat et dans chaque département ministériel : le Ministre chargé du département concerné, qui est responsable des marchés passés par les services centraux, des marchés passés dans la Région de Dakar et des marchés des agences ou organisations sans personnalité morale relevant de son département ;
-  pour les marchés de l'Etat passés dans les Régions autres que la Région de Dakar : le gouverneur de région ;
-  pour les marchés des collectivités locales : les présidents des conseils régionaux, les maires et les présidents des conseils ruraux ou leurs représentants dûment habilités sont responsables respectivement des marchés à passer par les régions, les communes et les communautés rurales ;
-  pour les marchés des établissements publics, agences et autres organismes ayant la personnalité morale : l'organe exécutif désigné conformément aux règles qui leur sont applicables ;
-  la signature des marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire relève de la compétence du Directeur Général de la société quel que soit leur montant.

Toutefois, pour les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire, l'avis favorable du Conseil d'Administration préalable à la signature des marchés, matérialisé par le procès verbal des délibérations, est requis lorsque :

-  les marchés sont passés par une société nationale ou une société anonyme à participation publique majoritaire créée depuis moins de 12 mois ;
-  lorsque le représentant légal décide de retenir un candidat autre que celui proposé par la commission des marchés.

### 3.1.2.6 Approbation des marchés

L'acte d'approbation, matérialisé par la signature de l'autorité compétente à ce titre, est la formalité administrative nécessaire pour donner effet au marché. Les autorités compétentes pour l'approbation des marchés sont présentées dans les tableaux qui suivent :

 pour les marchés des administrations centrales de l'Etat :


SEUILS D'APPROBATION DES MARCHES en F CFA (TTC)	
Montant du marché	Autorité chargée de l'approbation
Marché $\geq$ 100 000 000	Ministre chargé des finances
100 000 000 > marché $\geq$ 50 000 000	Ministre dépensier
Marché < 50 000 000	Ministre dépensier pour la région de Dakar
	Gouverneur de région excepté Dakar

 pour les marchés des collectivités locales :

Les marchés des collectivités locales dont les montants sont indiqués dans le tableau ci-dessous sont approuvés par le représentant de l'État :

SEUILS D'APPROBATION DES MARCHES en F CFA (TTC)		
Caractéristiques	Montant du marché	Autorité chargée de l'approbation
Toutes les régions (Conseils régionaux)	marché $\geq$ 100 000 000	Gouverneur de région
- Villes de la région de DAKAR - Communes chef-lieux de région - Communes d'un budget $\geq$ 300 000 000	marché $\geq$ 50 000 000	Préfet
Autres communes	marché $\geq$ 15 000 000	Préfet
Communautés rurales	marché $\geq$ 15 000 000	Sous-Préfet

Les marchés d'un montant inférieur aux seuils ci-dessus ne sont pas soumis à la formalité d'approbation.

 pour les marchés des établissements publics, agences et organismes dotés de la personnalité morale :

SEUILS D'APPROBATION DES MARCHES en F CFA (TTC)	
Montant du marché	Autorité chargée de l'approbation
Marché $\geq$ 150 000 000	Ministre chargé des finances
150 000 000 > marché $\geq$ 50 000 000	Président du Conseil d'Administration
Marché < 50 000 000	Directeur de l'établissement

### **3.1.3 Procédures**

Le code des marchés publics prévoit quatre (04) procédures d'appel d'offres à savoir :

- ✚ appel d'offres ouvert (article 60 à 70 du CMP) ;
- ✚ appel d'offres avec pré-qualification (article 60 à 65 et 71 du CMP) ;
- ✚ appel d'offres ouvert en deux étapes (article 60 à 65 et 72 du CMP);
- ✚ appel d'offres restreint (article 60 à 65, 73 et 74 du CMP).

Toutefois l'appel d'offres ouvert constitue le mode de passation des marchés auquel les autorités contractantes doivent recourir par principe. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les conditions prévues par le CMP.

En effet, le CMP prévoit des procédures spécifiques telles que :

- ✚ l'entente directe qui est applicable dans les cas prévus à l'article 76 du CMP ;
- ✚ la Demande de Renseignements et de Prix (DRP) pour les fournitures, travaux ou services dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés à l'article 53 du CMP et rappelés au point 3.1.2.3 du présent rapport ;
- ✚ la consultation restreinte pour les marchés de prestations intellectuelles ;
- ✚ les marchés à commande ou marchés de clientèle lorsque l'autorité contractante ne peut déterminer à l'avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou services courants nécessaires à ses besoins.

## **3.2 Constats relatifs au dispositif des marchés publics**

### **3.2.1 Responsabilité des MO et MOD**

#### **3.2.1.1 Modalités de fonctionnement de la CPM**

Les membres de la Cellule de Passation des Marchés (CPM) ont été désignés au titre de la gestion 2011 par décision portant création de la Cellule de Passation des Marchés N°000663/SAED/DG/DRH/DMC/ASD/nd. La mise en place de la Cellule de Passation des marchés est conforme à l'arrêté N° 011586 du 28/12/07 pris en application de l'article 35 du Code des Marchés Publics relatif aux cellules de passation des marchés des autorités contractantes

Mr Harouna Sileymane DIA a été nommé chef de la Cellule de Passation des Marchés par décision portant N°00684/SAED/DRHA/SGPERS/AS.

Il faut noter par ailleurs que la Cellule est composée d'un service Gestion des Marchés et d'une Section Gestion des Commandes :

<b>COMPOSITION DE LA CELLULE DE PASSATION DES MARCHES AU TITRE DE LA GESTION 2011</b>	
<b>Poste</b>	<b>Membres</b>
Chef de la Cellule de Passation des marchés	Mr Harouna Sileymane DIA
Composition de la Cellule	Service Gestion des Marchés
	Section Gestion des Commandes

Conformément à l'arrêté n° 011586 du 28 décembre 2007 relatif aux cellules de passation des marchés des autorités contractantes, la CPM est responsable des activités suivantes :

- ✚ examen préalable de tout document à soumettre à l'autorité contractante en matière de marchés publics ;
- ✚ examen préalable de tout document à transmettre à des tiers en matière de marchés publics ;
- ✚ examen préalable de tout document à signer avec des tiers en matière de marchés publics ;
- ✚ classement et archivage de tous les documents relatifs aux marchés publics passés par les différents services ;
- ✚ établissement, en début d'année, du plan consolidé annuel de passation des marchés de l'Autorité contractante ;
- ✚ établissement de l'avis général de passation des marchés et sa publication conformément aux articles 6 et 56 du Code des Marchés Publics ;
- ✚ insertion des avis et autres documents relatifs à la passation des marchés dans le système national informatisé de gestion des marchés ;
- ✚ tenue du secrétariat de la Commission des Marchés ;
- ✚ appui aux différents services pour les opérations de passation de marchés ;
- ✚ réalisation et tenue de tableaux de bord sur les délais de mise en œuvre des différentes étapes des procédures de passation des marchés et réalisation des calendriers d'exécution des marchés ;
- ✚ identification des besoins de formation des services en matière de marchés publics ;
- ✚ liaison avec les missions extérieures, notamment celles d'audit des marchés, initiées par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- ✚ établissement de rapports trimestriels sur la passation et l'exécution des marchés à l'intention des autorités compétentes pour transmission à la Direction Centrale des Marchés Publics et à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics.

### **3.2.1.2 Capacité de lancer des mises en concurrence**




Le personnel doit être suffisamment formé pour une meilleure maîtrise des procédures de passation de marché.

## **3.2.2 Exercice des contrôles**

### **3.2.2.1 Rappels**

***Article 137 CMP 2007 / 139 CMP 2011 :***

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses respectivement applicables aux autorités contractantes, le contrôle des marchés publics est assuré par :

-  la Direction chargée du Contrôle des Marchés Publics qui est chargée de contrôler a priori la passation des marchés ;
-  les organes de contrôle interne existant au sein de l'autorité contractante qui effectuent un contrôle à posteriori dans des conditions fixées par chaque autorité contractante.
-  l'Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics qui effectue un contrôle à posteriori.


### 3.2.2.2 Exercice des contrôles

Le contrôle de la passation des marchés est effectué par la Direction du Contrôle des Marchés Publics (DCMP).

Créée par le décret n°2007-547 du 25 avril 2007, la DCMP a pour mission :

- ✚ d'assurer le contrôle à priori des procédures de passation et d'attribution des marchés publics ;
- ✚ d'émettre des avis sur les décisions concernant l'attribution des marchés et d'accorder à la demande des autorités contractantes, les autorisations et dérogations nécessaires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation ;
- ✚ d'assurer, en relation avec l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, la formation, l'information et le conseil de l'ensemble des acteurs de la Commande publique sur la réglementation et les procédures applicables ;
- ✚ de contribuer, en relation avec l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, à la collecte et à l'analyse des données ainsi qu'à l'établissement des statistiques sur les marchés publics.

L'organigramme de la DCMP est présenté ci-dessous :

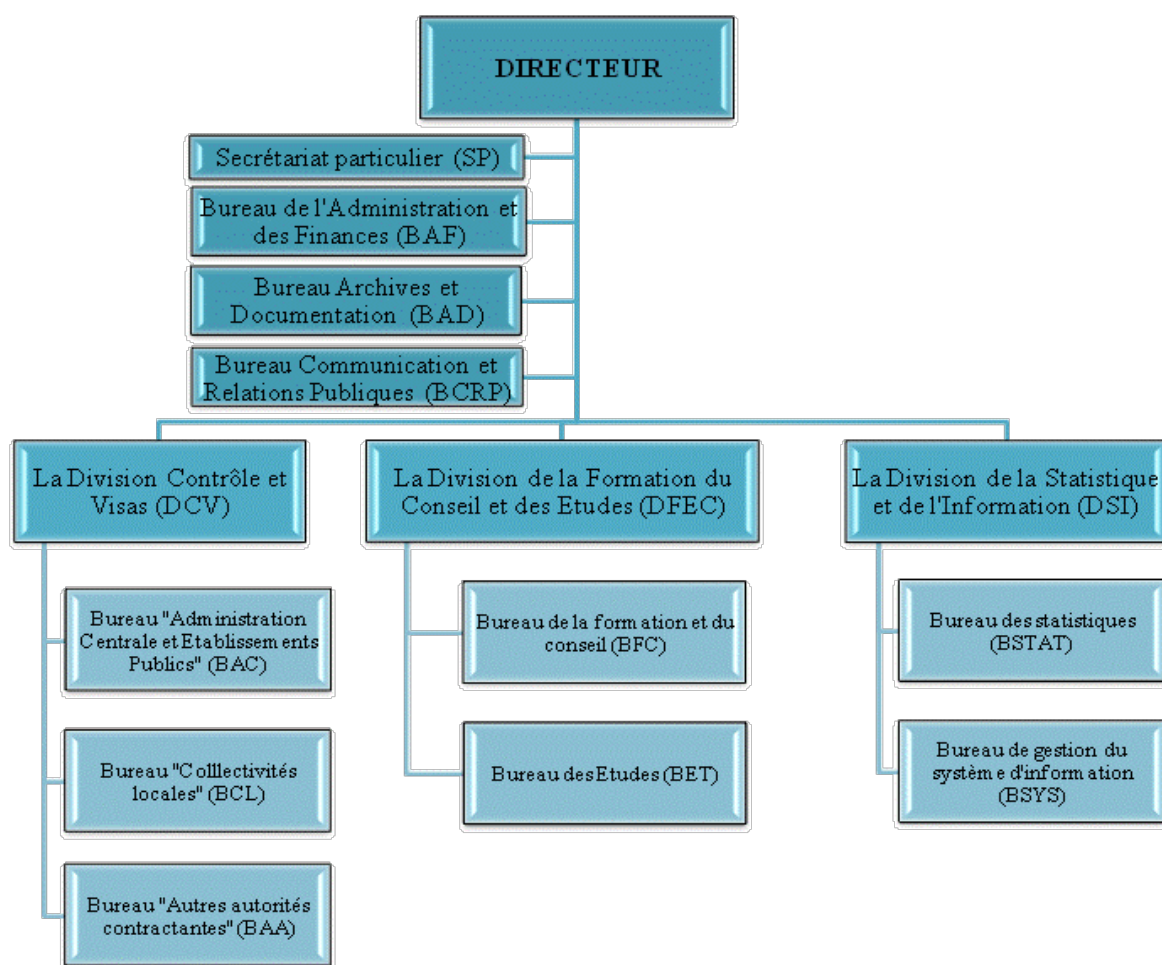

Ainsi, la DCMF est un acteur majeur du système institutionnel de la passation des marchés.

Soulignons par ailleurs, que les Commissions de Marchés et Cellules de Passation des Marchés jouent également un rôle important dans le respect de la conformité du processus.

### 3.2.2.3 Fonctionnement de la Commission des Marchés de la SAED

Rappelons ici que le CMP prévoit la mise en place de Commissions des Marchés chargées de l'Ouverture des plis, de l'évaluation des offres et de l'attribution provisoire des marchés ainsi que celle de Cellules de Passation des Marchés chargée de veiller à la qualité des dossiers de passation de marchés ainsi qu'au bon fonctionnement de la CM.

En 2011, deux commissions de Marchés ont été mises en place à la SAED. La première a été mise en place par Décision en date du 06 janvier 2011 et la seconde en date du 23 mars 2011.

#### 1 Commission des Marchés mise en place le 06 janvier 2011

Fonction	Noms	Postes
Président	Mr Mor DIOP	Directeur Général Adjoint
Membres	Mr Hamet FALL	Directeur Financier et Comptable
	Mr Aboubacry SOW	Directeur des Aménagements et des Infrastructures Hydro-agricoles
	Mme Khadijéto KANE	Directeur des Ressources Humaines et de l'Administration
	Mr Mouhamadou GUEYE	Le représentant du contrôleur financier
	Mamadou NDAO	Le représentant du Ministère de l'Agriculture
Suppléants	Mankeur DIA	Chef Division Trésorerie et Financement
	Sora FALL	Chef Division Planification
	Amadou THIAM	Chef Cellule Suivi-Evaluation
	Alioune Badara DIALLO	Conseiller Technique en Aménagement

La composition de la Commission des Marchés de la SAED est conforme à l'arrêté N° 011588 du 28/12/07 pris en application de l'article 36-1 du Code des Marchés publics et fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes.

## 2 Commission des Marchés mise en place le 23 mars 2011

Fonction	Noms	Postes
Président	Mr Mor DIOP	Directeur Général Adjoint
Membres	Mr Hamet FALL	Directeur Financier et Comptable
	Mr Aboubacry SOW	Directeur des Aménagements et des Infrastructures Hydro-agricoles
	Mme Khadijéto KANE	Directeur des Ressources Humaines et de l'Administration
	Mr Mouhamadou GUEYE	Le représentant du contrôleur financier
	Mme Taco DIAWARA	Le représentant du ministère de l'agriculture
Suppléants	Mankeur DIA	Chef Division Trésorerie et Finances
	Abdoulaye GUEYE	Chef Division Etudes et Travaux
	Amadou THIAM	Chef Cellule Suivi-Evaluation
	Amadou Ndatté SALL	Contrôle financier

La composition de la Commission des Marchés de la SAED est conforme à l'arrêté N° 011588 du 28/12/07 pris en application de l'article 36-1 du Code des Marchés publics et fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes.

### 3.2.2.4 Rôle du Contrôleur Financier







Il existe au sein de la SAED, un contrôleur de gestion chargé d'effectuer les contrôles nécessaires des documents comptables avant paiement.



### **3.2.3 Régulation**

La régulation des marchés publics est assurée par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) qui est une autorité administrative indépendante, rattachée à la Primature. Elle est créée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 modifiant le Code des Obligations de l'Administration et est dotée de l'autonomie financière et de gestion. La mission et les attributions de l'ARMP sont définies par le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP.

L'ARMP a pour mission d'assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Cette mission de régulation a pour objet :

-  d'émettre des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition des politiques et de l'assistance à l'élaboration de la réglementation en matière de marchés publics et de délégations de service public ;
-  de contribuer à l'information, à la formation de l'ensemble des acteurs de la commande publique, au développement du cadre professionnel et à l'évaluation des performances des acteurs du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et des délégations de service public ;
-  d'exécuter des enquêtes ;
-  de mettre en œuvre des procédures d'audits indépendants ;
-  de sanctionner les irrégularités constatées ;
-  de procéder au règlement non juridictionnel des litiges nés à l'occasion de la passation des marchés publics et des délégations de service public, ou de rendre des avis dans le cadre du règlement amiable des litiges nés à l'occasion de leur exécution.

L'ARMP est composée de trois organes : le Conseil de Régulation, le Comité de Règlement des Différends et la Direction Générale.



## **4. AUDIT DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES**

### **4.1 Constats généraux**

#### **4.1.1 Constats de carence documentaire**

##### **4.1.1.1 Carence documentaire concernant la passation**




Nous n'avons pas obtenu la publication définitive des marchés :

-  Fourniture, livraison et installation des équipements électromécaniques et électriques d'un montant de 1 010 389 697 HT/HD attribué à EIFFAGE/Sénégal ;
-  Travaux de terrassement et de génie civil pour l'aménagement des réseaux secondaires d'alimentation et de drainage ainsi que des pistes de desserte de 2500ha d'irrigation dans la zone du Gorom d'un montant de 5 186 693 990 TTC attribué à RC Construction.

Les lettres d'invitation adressées aux candidats ne sont pas déchargées par ces derniers. Nous ne disposons non plus, de cahier de transmission desdites lettres. Par conséquent, nous ne pouvons pas valider la réception effective des lettres d'invitation.

Les DRP passées par la SAED ne font pas l'objet de publicité spécifique ce qui est une bonne pratique.

Les DRP passées par la SAED en 2011 ne sont pas accompagnées des éléments ci-après comme le stipule la circulaire de mise en œuvre de la DRP N°0004/PM/CAB/CP:

-  formulaire de soumission ;
-  projet de contrat ;
-  bordereau de prix.

Nous n'avons pas obtenu la lettre informant le soumissionnaire **RC PORTUGAFRIQUE** du rejet de son offre pour la DRP « **Travaux de maintenance des périmètres irrigués** » d'un montant de 31 122 500 TTC.

Des pénalités de retard ne sont pas prévues dans les contrats des DRP « **Travaux de maintenance des périmètres irrigués** » et « **Formation d'un (01) agent de la SAED sur Oracle version 10g et sur l'administration de Windows 2008 Serveur** » d'un montant de 5 310 000 TTC.

Nous n'avons pas obtenu le courrier de transmission matérialisant l'envoi des copies des actes de déclaration de la charte de transparence signées à l'ARMP et à la DCMP.

Les rapports trimestriels ont été produits toutefois, nous n'avons pas obtenu le courrier de transmission de ces rapports à la DCMP et à l'ARMP conformément à l'arrêté N°011586 du 28/12/2007 pris en application de l'article 35 du CMP relatif aux CPM des AC.

Le manuel des procédures de la SAED n'est pas mis à jour, au regard du Code des Marchés en vigueur.

#### **4.1.1.2 Carence documentaire concernant l'exécution financière**

Nous n'avons pas relevé d'anomalies majeures concernant l'exécution financière

### **4.1.2 Fractionnements potentiels**

#### **4.1.2.1 Rappels**

##### ***Article 54.5 du CMP :***

Les autorités contractantes ne peuvent en aucun cas fractionner les dépenses ou sous estimer la valeur des marchés de façon à les soustraire aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du CMP.

#### **4.1.2.2 Évaluation des fractionnements potentiels**

L'examen des DRP lancées par la SAED en 2011 ne révèle pas de cas de fractionnement.

## **4.2 Audit de la passation des marchés**

### **4.2.1 Dossiers d'Appels d'Offres (DAO)**

#### **4.2.1.1 Rappels**

##### **a) AOO**

##### ***Article 58 (Section 3 - Dossier d'appel à la concurrence)***

Le dossier d'appel à la concurrence contient la totalité des pièces et documents nécessaires à la consultation et à l'information des candidats selon la procédure choisie, à savoir:

- a) les pièces relatives aux conditions de l'appel à la concurrence : la référence à l'avis d'appel d'offres ou à l'avis d'appel à candidatures, ou la lettre de consultation, ainsi que le règlement

de la procédure, sauf si les informations figurant dans l'avis d'appel à la concurrence sont suffisantes eu égard à la procédure et au marché concernés ;

- b) les pièces constitutives du futur marché, notamment : projet, date de soumission, cahier des prescriptions spéciales, cahier des clauses administratives générales, cahier des clauses techniques générales, autres pièces requises en fonction de l'objet du marché;
- c) des informations communiquées par l'autorité contractante à titre indicatif en vue de faciliter l'établissement de leurs offres par les candidats, qui ne sont pas des pièces constitutives du marché.

Le dossier d'appel à la concurrence est remis aux candidats gratuitement ou à des conditions financières stipulées dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans la lettre de consultation.

Lorsque le dossier d'appel à la concurrence n'est pas remis gratuitement, ces conditions financières doivent être fixées de façon à ne pas dépasser les frais engagés pour le reproduire et le remettre aux candidats. Toutefois, dans ce dernier cas, un exemplaire du dossier devra être disponible pour être consulté gratuitement sur place par les candidats qui le souhaitent.





b) DRP

**Article 77.2 du CMP 2007 / 78.2 du CMP 2011 :**





L'autorité contractante sollicite simultanément par écrit des prix auprès d'au moins cinq entreprises en définissant la nature des prestations recherchées et en faisant référence à des normes dans toute la mesure du possible

***Circulaire N° 0004/PM/CAB/CP du 31 mars 2009 portant instruction pour la mise en œuvre de la procédure de Demande de Renseignements et de Prix.***

Pour les travaux, fournitures et services dont la valeur TTC est supérieure aux seuils fixés par l'arrêté n° 11585 du 28 décembre 2007 du Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances et n'atteint pas ceux définis à l'article 53 du CMP, la saisine des candidats présélectionnés doit se faire par une lettre d'invitation précisant au minimum :


-  l'objet de la consultation ;
-  la description concise des prestations ;
-  les spécifications techniques requises ;
-  les délais de remise des offres et délais d'exécution.

Elle doit également être accompagnée :

-  d'un formulaire de soumission ;
-  d'un modèle simplifié d'instructions aux soumissionnaires mentionnant s'il y'a lieu les qualifications minimales requises ;
-  d'un bordereau de prix ;
-  et d'un projet de contrat.

Les modalités de publicité pour la présélection des candidats sont libres. Toutefois, la liste des candidats présélectionnés peut être établie à partir d'un fichier de prestataires constitué par l'autorité contractante au terme d'un appel à manifestations d'intérêt initié en début de gestion, et mis à jour périodiquement en fonction des nécessités de service.

#### 4.2.1.2 Constats

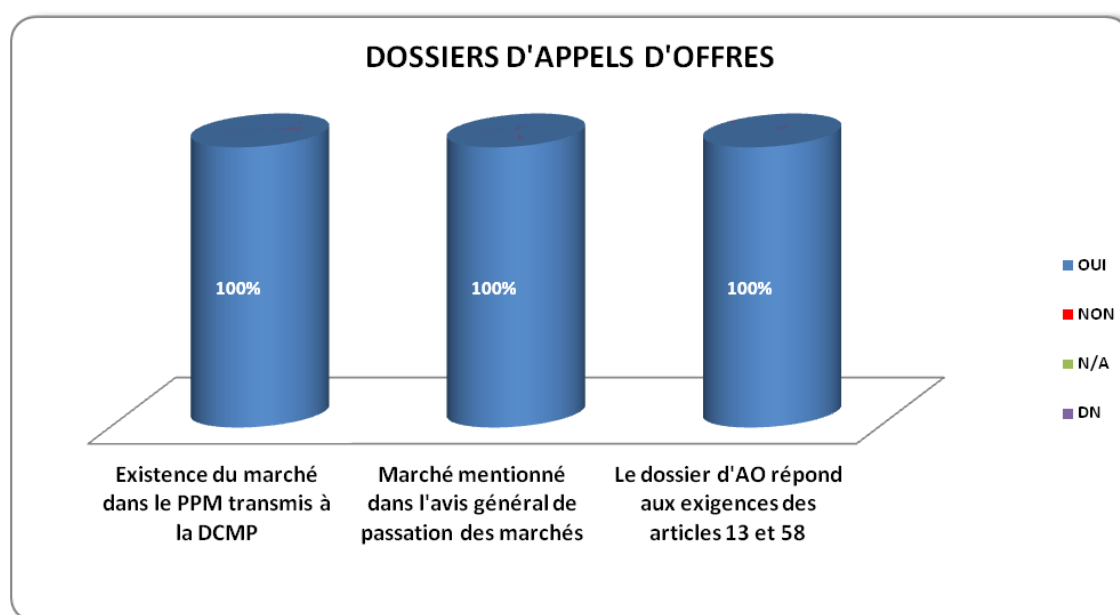

#### 4.2.1.3 Commentaires

Nous n'avons pas de commentaires particuliers à formuler concernant le Plan de Passation, l'Avis Général et les Dossiers d'Appel d'Offres.

### 4.2.2 Avis d'Appels d'Offres (AAO)

#### 4.2.2.1 Rappels

##### a) AAO

#### **Article 60 du CMP**

L'appel d'offres est la procédure par laquelle une autorité contractante attribue le marché, après appel à la concurrence, au candidat réunissant les conditions de qualification qui remet l'offre conforme évaluée la moins disante, sur la base de critères quantifiés en termes monétaires préalablement portés à la connaissance des candidats, sans négociation.

- ✚ L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. Il est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une offre, et restreint lorsque seuls peuvent remettre une offre les candidats qui y ont été directement invités par l'Autorité Contractante. L'appel d'offres ouvert peut comprendre une phase de pré-qualification.
- ✚ L'appel d'offres ouvert constitue le mode de passation des marchés auquel les autorités contractantes doivent recourir par principe. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les conditions stipulées dans le CMP.
- ✚ L'appel d'offres peut également être organisé en deux étapes, dans les conditions prévues dans le CMP, en vue dans un premier temps de préciser les critères ou les solutions techniques auxquels les offres devront répondre puis, dans un deuxième temps, d'attribuer le marché sur les bases retenues par l'autorité contractante.

b) DRP (invitation des candidats)


**Article 77.2 du CMP 2007/78.2 du CMP 2011 :**

L'autorité contractante choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature du marché.

***Circulaire N° 0004/PM/CAB/CP du 31 mars 2009 portant instruction pour la mise en œuvre de la procédure de Demande de Renseignements et de Prix.***

La lettre d'invitation, adressée simultanément aux fournisseurs à consulter, doit obligatoirement inclure les noms des candidats consultés (5 au moins, conformément à l'article 77 du CMP 2007/78 du CMP 2011). Les délais prescrits pour la remise des offres et l'exécution des prestations doivent être raisonnables et compatibles avec la consistance de la commande envisagée.

**4.2.2.2 Constats**

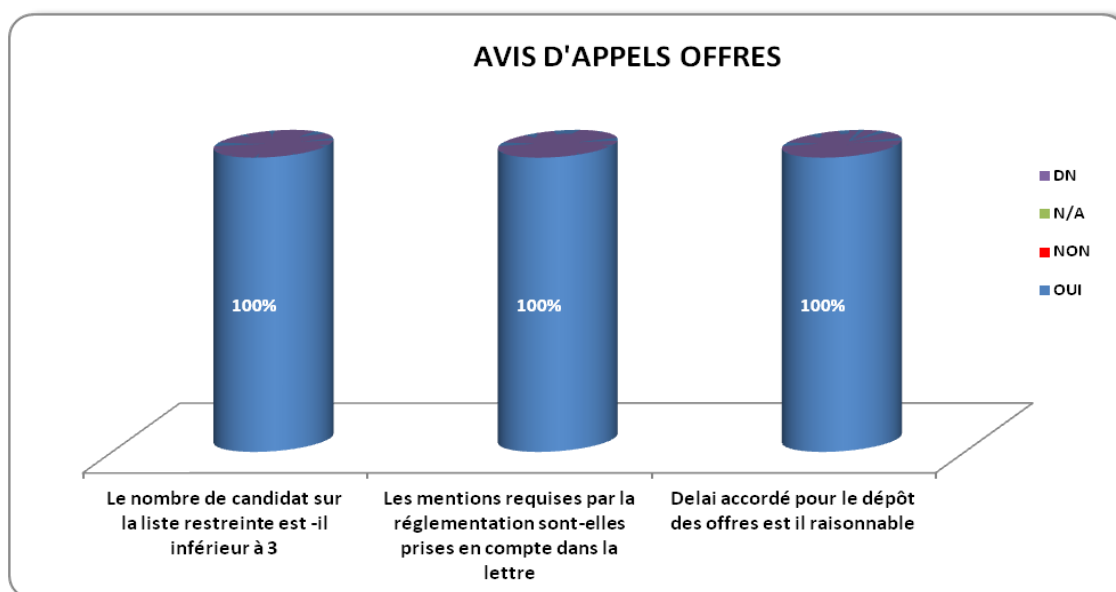

#### **4.2.2.3 Commentaires**

Nous n'avons de commentaires particuliers à formuler sur les Avis d'Appel d'Offres.

### **4.2.3 Réception et dépouillement des offres**

#### **4.2.3.1 Rappels**

a) AOO

***Article 67 du CMP***

A l'expiration des dates et heures limites de dépôt des offres, la commission des marchés est chargée de procéder à l'ouverture des plis. Seuls peuvent être ouverts les plis reçus au plus tard à la date et heure limites de dépôt des offres.

Les plis sont ouverts en séance publique en présence des membres de la commission des marchés compétente à la date et à l'heure limites de dépôt des offres précisées dans le dossier d'appel à la concurrence ou à la date spécifiée en cas de report. Les plis reçus après le délai fixé doivent être renvoyés aux candidats sans avoir été ouverts.

Tous les candidats qui ont soumis des offres sont autorisés par l'autorité contractante à assister ou à se faire représenter à l'ouverture des plis. Les candidats ou leurs représentants qui sont présents signeront un registre attestant de leur présence. Les représentants des organismes de financement peuvent également assister à l'ouverture des plis ou se faire représenter. Cette faculté est mentionnée dans l'avis d'appel d'offres.


Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre, la présence ou l'absence de garantie financière, les rabais éventuels ainsi que toute autre information que l'autorité contractante peut juger utile de faire connaître, sont lus à haute voix lors de l'ouverture des plis. Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, ces informations sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres de la commission des marchés présents et remis à tous les candidats.

b) DRP

***Circulaire N° 0004/PM/CAB/CP du 31 mars 2009 portant instruction pour la mise en œuvre de la procédure de Demande de Renseignements et de Prix.***

La présence des soumissionnaires à la séance d'ouverture des plis n'est pas obligatoire.

#### 4.2.3.2 Constats

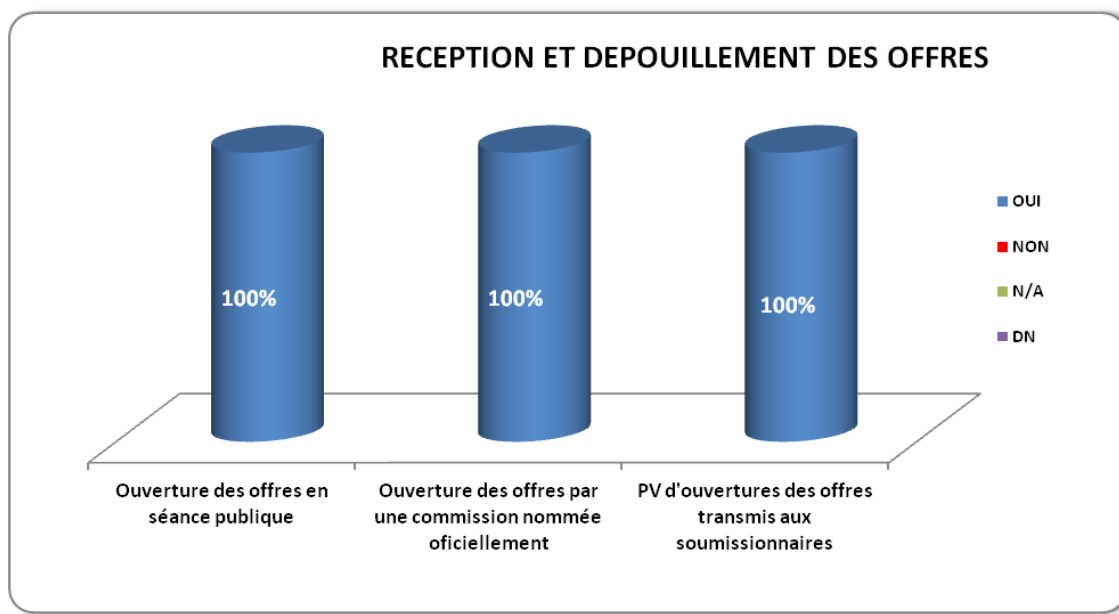

#### 4.2.3.3 Commentaires

Nous n'avons de commentaires particuliers à formuler sur la réception et le dépouillement des offres.

### 4.2.4 Évaluations des offres et attribution des marchés

#### 4.2.4.1 Rappels

##### a) AOO

##### **Article 68 du CMP**

Avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l'article 45 CMP 2007 /44 CMP 2011, et rejette les offres non recevables.

La commission détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges.



**Article 69 du CMP**

Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats et aucune modification des offres ou des prix ou des conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée. La commission peut toutefois corriger les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de l'examen des offres et peut demander aux candidats de préciser la teneur de leurs offres afin d'en faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison. Cette demande doit être faite par écrit dans le respect strict des cahiers des charges. La réponse doit également être adressée par écrit.

**Article 70 du CMP 2007**






La commission procède ensuite à une évaluation détaillée en fonction des critères établis conformément à l'article 59 du CMP, mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence. Elle propose à l'autorité contractante l'attribution du marché au candidat qui a l'offre conforme évaluée la moins disante et qui est reconnu réunir les critères de qualification mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence.

**Article 70 CMP 2011 :**

La commission procède ensuite à une évaluation détaillée en fonction des critères établis conformément à l'article 59 du CMP, mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence. Elle propose à l'autorité contractante dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la séance d'ouverture des plis, l'attribution du marché au candidat qui a l'offre conforme évaluée la moins disante et qui est reconnu réunir les critères de qualification mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence. Exceptionnellement, ce délai peut faire l'objet de prorogation dans la limite maximale de dix (10) jours, sur demande motivée de l'autorité contractante adressée à la Direction chargée du contrôle des marchés publics.

**Article 79-5 du CMP 2007/80.7 du CMP 2011**

L'évaluation des propositions et la désignation de l'attributaire s'effectuent dans tous les cas :

-  soit sur la base de la qualité technique de la proposition, résultant en particulier de l'expérience du candidat, de la qualification des experts et de la méthode de travail proposés, ainsi que du montant de la proposition ;
-  soit sur la base d'un budget prédéterminé dont le candidat doit proposer la meilleure utilisation possible ;
-  soit sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu une note technique minimum ;
-  soit, dans les cas où les prestations sont d'une complexité exceptionnelle ou d'un impact considérable ou encore lorsqu'elles donneraient lieu à des propositions difficilement comparables, exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition. Dans ce dernier cas, l'exécution du marché doit donner lieu à un contrôle des prix de revient.
-  le marché peut ensuite faire l'objet de négociations avec le candidat dont la proposition est retenue. Les négociations ne peuvent en aucun cas être conduites avec plus d'un candidat à la fois.

b) DRP

**Article 77.2 du CMP 2007/ 78.2 du CMP 2011 :**

L'autorité contractante attribue le marché au candidat présentant l'offre évaluée la moins disante et rédige un procès-verbal d'attribution.

**Article 77.3 du CMP 2007/ 78.3 du CMP 2011:**

Les marchés relatifs au DRP donnent lieu à des contrats écrits de forme libre. Par dérogation, les commandes répondant à des conditions de montant et de nature spécifiées par Arrêté n° 11585 du 28 décembre 2007 du Ministre chargé des Finances peuvent être dispensées de forme écrite et donner lieu à règlement sur mémoires ou factures.


**Circulaire N° 0004/PM/CAB/CP du 31 mars 2009 portant instruction pour la mise en œuvre de la procédure de Demande de Renseignements et de Prix.**

L'ouverture des plis et la désignation de l'attributaire provisoire doivent être matérialisées par des procès verbaux.

La publication d'un avis d'attribution telle que prescrite aux articles 81 et 83 du CMP 2007 /83 et 85 du CMP 2011 n'est pas obligatoire. Toutefois, l'autorité contractante a l'obligation d'informer par écrit les soumissionnaires non retenus.

La publication d'un avis d'attribution telle que prescrite aux articles 81 et 83 du CMP /83 et 85 du CMP 2011 n'est pas obligatoire. Toutefois, l'autorité contractante a l'obligation d'informer par écrit les soumissionnaires non retenus.


#### 4.2.4.2 Constats relatifs à l'évaluation

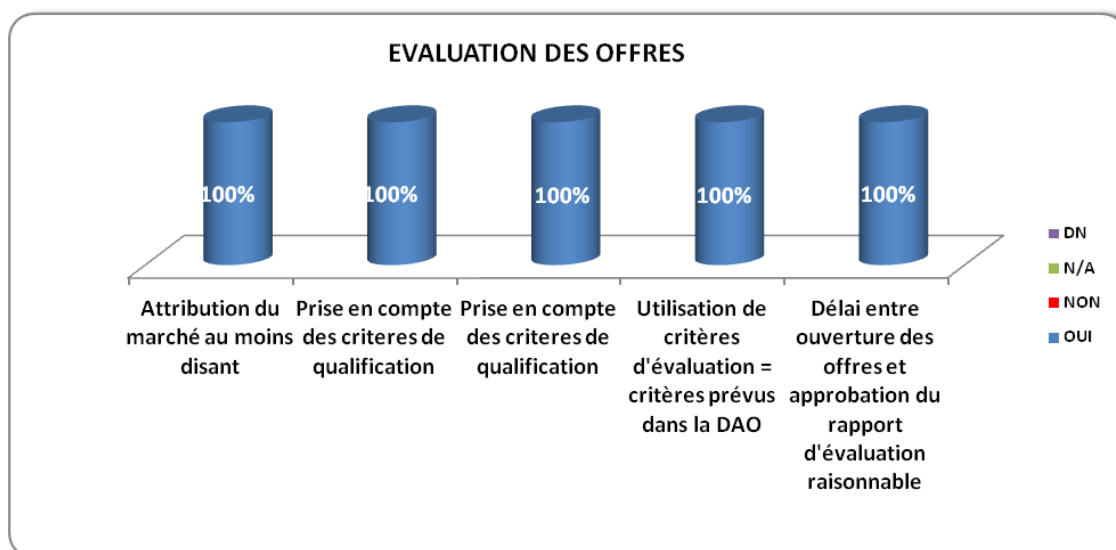

#### 4.2.4.3 Commentaires relatifs à l'évaluation

Nous n'avons pas de commentaires particuliers à formuler sur l'évaluation des offres.

#### 4.2.4.4 Constats relatifs à l'Attribution

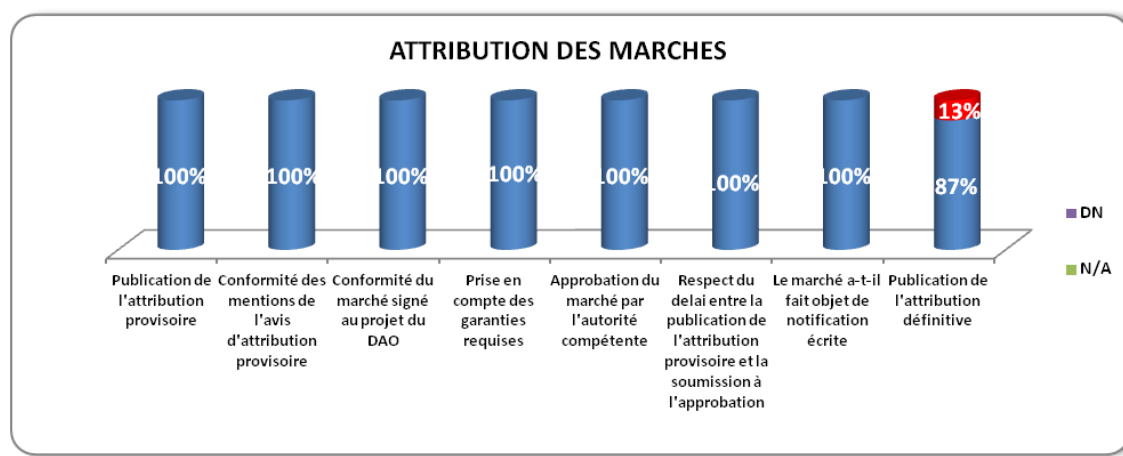

#### 4.2.4.5 Commentaires relatifs à l'Attribution

Les deux (02) marchés ci-dessous n'ont pas fait l'objet de publication définitive :

- ✚ Fourniture, livraison et installation des équipements électromécaniques et électriques d'un montant de 1 010 389 697 HT/HD attribué à EIFFAGE/Sénégal ;
- ✚ Travaux de terrassement et de génie civil pour l'aménagement des réseaux secondaires d'alimentation et de drainage ainsi que des pistes de desserte de 2500ha d'irrigation dans la zone du Gorom d'un montant de 5 186 693 990 TTC attribué à RC Construction.

## **4.2.5 Cas particulier des marchés passés par entente directe**

### **4.2.5.1 Rappels**




#### **Article 75 du CMP 2007/ 76 du CMP 2011 :**

Les marchés sont dits par "entente directe" lorsque l'autorité contractante engage directement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu.

Le marché par entente directe ne peut être passé qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle spécifique des prix de revient durant l'exécution des prestations. Le marché précise les obligations de transmission d'informations financières et comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis en vue de permettre ce contrôle.

#### **Article 76 du CMP 2007 :**


Il ne peut être passé des marchés par entente directe qu'après avis de la Direction chargée du Contrôle des Marchés Publics dans les cas suivants :

-  pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ;
-  pour les marchés destinés à répondre à des besoins qui, pour des raisons tenant à la détention d'un droit d'exclusivité, ne peuvent être satisfaits que par un cocontractant déterminé ;
-  pour des fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait l'objet d'un premier marché exécuté par le même titulaire, à la condition que le marché initial ait été passé selon la procédure d'appel d'offres, que le marché complémentaire porte sur des fournitures, services ou travaux qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue et extérieure aux parties, et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal. Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser un tiers du montant du marché principal, avenants compris.


Les marchés passés par entente directe donnent lieu à un compte rendu détaillé dans le rapport annuel établi par l'Organe chargé de la Régulation des Marchés Publics.

#### **Article 76 du CMP 2011 :**

Il ne peut être passé de marchés par entente directe qu'après :

-  autorisation de la Direction chargée du contrôle des marchés publics dans les cas suivants :

- a) pour les marchés destinés à répondre à des besoins qui, pour des raisons tenant à la détention d'un droit d'exclusivité, ne peuvent être satisfaits que par un cocontractant déterminé ;
- b) pour des fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait l'objet d'un premier marché exécuté par le même titulaire, à la condition que le marché initial ait été passé selon la procédure d'appel d'offres et que le marché complémentaire ne porte que sur des fournitures, services ou travaux qui ne figurent pas dans le marché initial conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue et extérieure aux parties, et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal. Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser un tiers du montant du marché principal, avenants compris.

 avis de la Direction chargée du contrôle des marchés publics dans les cas suivants :

- a) Pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige.

Sont considérés comme secrets :

- les marchés de fournitures, services et travaux passés pour assurer les besoins de la défense nationale et concernant :
  - Les marchés de fournitures et de services qui ont pour objet la conception, l'essai, l'expérimentation, la réalisation, l'acquisition, le maintien opérationnel, l'utilisation ou la destruction des armes, munitions et matériels de guerre ;
  - Les marchés de fournitures qui ont pour objet la réalisation de démonstrateurs ou de prototypes d'armes, munitions ou matériels de guerre ;
  - Les marchés de fournitures qui ont pour objet les composants, les outillages, les consommables et les moyens d'évaluation et d'essais, spécifiquement conçus pour la fabrication, l'emploi ou le maintien en condition opérationnelle des armes, munitions et matériels de guerre ou l'emploi des armes, munitions et matériels de guerre ou concourant à leur efficacité militaire ;
  - Les marchés de service qui présentent un lien direct avec la stratégie militaire ou l'emploi des armes et qui ont pour objet soit les études exploratoires et les études technico-opérationnelles relatives aux équipements futurs, les études biologiques, médicales, hydrographiques, soit les études prospectives ;
  - Les marchés de travaux directement liés à la réalisation, l'emploi, le maintien en condition opérationnelle et l'évaluation des armes, munitions et matériels de guerre ;
- les marchés portant sur des fournitures, services et travaux :
  - destinés à des fins de défense civile. Ces marchés portent sur des prestations visant à assurer l'ordre public, la protection matérielle et morale des personnes et la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général ainsi que l'appui au maintien ou au rétablissement de la liberté d'action des autorités militaires sur l'ensemble du territoire ;
  - relatifs à la sécurité nationale passés en vue de prévenir une menace, notamment terroriste, et plus généralement de prestataires, qui du fait de leurs prestations, accèdent à des informations ou domaines sensibles dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité et la sûreté de l'Etat et à son potentiel scientifique et économique. Relèvent notamment de ces marchés, les travaux qui doivent être exécutés dans l'espace présidentiel particulièrement au Cabinet du Président de la République, au Palais de la République et ses annexes.

- les marchés passés en vertu d'un accord international relatif à la participation des troupes sénégalaises à des opérations de maintien de la paix ;

b) Les marchés pour lesquels, l'urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieurs à l'autorité, n'est pas compatible avec les délais et règles de forme exigés par la procédure d'appel ouvert ou restreint ;

c) les marchés passés dans le cadre des mesures de mobilisation générale et de mise en garde.

Pour les marchés visés aux paragraphes b) et c), l'organe chargé du contrôle des marchés publics en avise dans les vingt quatre heures. Ce délai passé, pour poursuivre la procédure, l'autorité contractante doit s'en référer au Premier Ministre qui décide de la continuation ou non de la procédure.

Dans tous les cas, en cas d'avis négatif émis par la DCMP, l'autorité contractante, qui en informe le Premier Ministre, ne peut poursuivre la procédure de passation qu'en saisissant le Comité de Règlement des Différends près l'Organe chargé de la régulation des marchés publics d'une requête motivée, accompagnée de l'avis contesté dont copie est transmise au Premier Ministre.

Le Premier Ministre peut certifier par notification écrite à l'Organe chargé de la régulation des marchés publics et à celui chargé du contrôle des marchés publics que, pour des raisons tenant aux circonstances exceptionnelles du cas concerné impliquant des motifs impérieux d'intérêt général, l'attribution du marché doit être poursuivie immédiatement.

#### 4.2.5.2 Constats

Le mode Entente Directe n'a pas été utilisé par la SAED en 2011.

### 4.2.6 Délais de passation des marchés

#### 4.2.6.1 Rappels

a) AOO

#### *Délais de présentation des offres et des candidatures (Article 63 du CMP)*

DELAIS DE PRESENTATION DES OFFRES ET DES CANDIDATURES				
Procédures	Délai de dépôt des offres ou demande de participation	Publication électronique	Procédure d'urgence	Procédure d'urgence et publication électronique
Appel d'Offres Ouvert avec ou sans préqualification	30 jours	25 jours	20 jours	15 jours

#### *Article 82 du CMP 2007 / 84 du CMP 2011*

Les marchés sont transmis à la personne responsable du marché pour signature dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'avis d'attribution.

**Article 83 du CMP 2007 / 85 du CMP 2011**

Dans les quinze (15) jours suivants la notification du marché, l'autorité contractante publie un avis d'attribution définitive.

**b) DRP**

Les délais prescrits pour la remise des offres et l'exécution des travaux doivent être raisonnables et compatibles avec la consistance de la commande envisagée (cf. Circulaire n°4 du 31/3/2009 portant instruction pour la mise en œuvre de la procédure de DRP).

**4.2.6.2 Constats**

Nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives concernant les délais de passation des marchés passés et revus de la SAED en 2011

**4.3 Audit de l'exécution financière****4.3.1 Etendue des travaux d'audit du volet financier****4.3.1.1 Concernant l'engagement**

Pour chacun des marchés passés par Appel d'Offres Ouvert (AOO), et par Demandes de Renseignement de Prix (DRP) sélectionnés, nous avons effectué le contrôle sur la procédure d'exécution financière.

**4.3.1.2 Concernant le contrôle et la certification du service fait**

Nous avons vérifié l'existence d'un procès verbal de réception, d'un bon de livraison ou d'un certificat administratif attestant que les travaux ou services ont été réalisés.

**4.3.1.3 Concernant la liquidation, le mandatement et le paiement des dépenses**

Pour chaque marché sélectionné, nous avons vérifié l'existence :

1. d'une facture définitive liquidée ;
2. d'une copie du moyen de paiement déchargée par le fournisseur.

#### 4.3.1.4 Limites de l'audit de l'exécution financière


Nous n'avons pas relevé de limite concernant l'exécution financière des marchés passés par la SAED en 2011.

### 4.3.2 Constats d'audit sur le volet d'exécution financière

#### 4.3.2.1 Production et gestion des garanties contractuelles

Nous n'avons pas relevé d'anomalies sur les garanties requises des marchés contrôlés.


#### 4.3.2.2 Constats d'audit - Engagement, liquidation et mandatement des dépenses

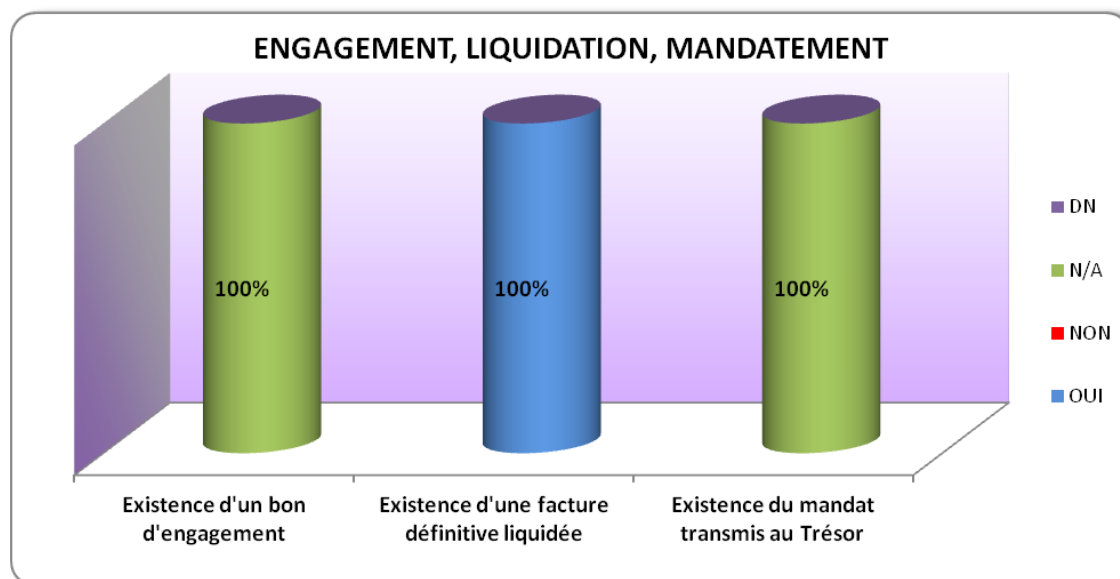

Nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives sur l'engagement, la liquidation des dépenses.



### 4.3.2.3 Réception et paiement des prestations

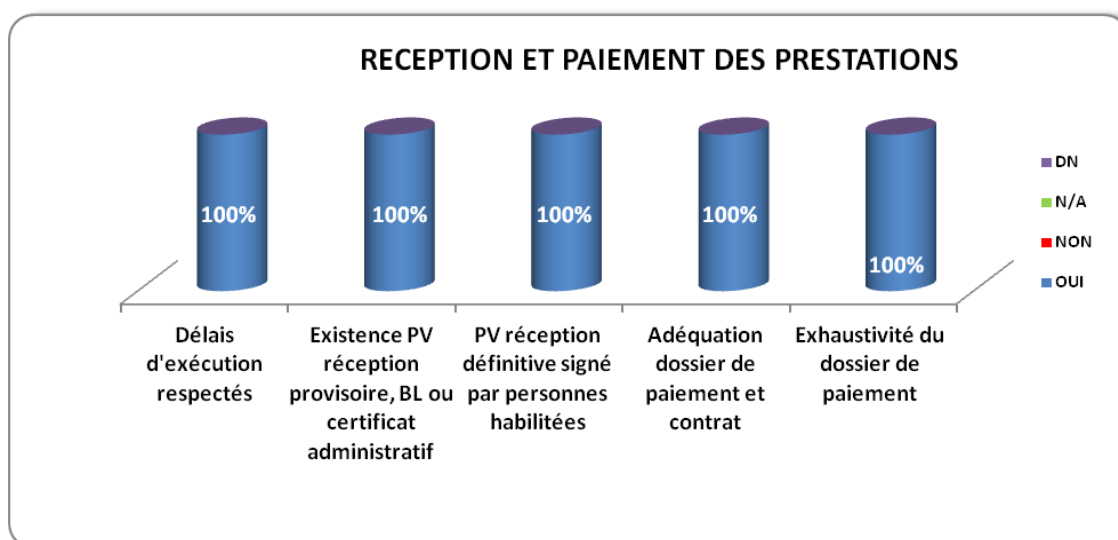

Nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives sur la réception et le paiement des marchés.

## 4.4 Audit de l'exécution physique

Les marchés de la SAED ne figurent pas dans l'échantillon devant faire l'objet de contrôle physique validé par l'ARMP.

## 5. RECOMMANDATIONS

### 5.1 Recommandations générales

#### 5.1.1 Recommandations relatives à l'archivage

Constats	Recommandations	Commentaires de la SAED
<p>Nous n'avons pas obtenu la publication définitive des marchés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fourniture, livraison et installation des équipements électromécaniques et électriques</li> <li>Travaux de terrassement et de génie civil pour l'aménagement des réseaux secondaires d'alimentation et de drainage ainsi que des pistes de desserte de 2500ha d'irrigation dans la zone du Gorom</li> </ul>	<p>Nous recommandons à la SAED de procéder à la publication définitive des marchés passés conformément au CMP.</p>	<p><i>La SAED a passé durant l'exercice 2011, vingt-deux (22) marchés. Tous les avis d'attribution provisoires ont été publiés.</i></p> <p><i>Pour les avis d'attribution définitive seuls vingt ont été retrouvés, soit 91% du total. Les deux restants ont certainement été publiés.</i></p> <p><i>Dans tous les cas, nous veillerons au classement de tous les avis.</i></p>
<p>Nous n'avons pas obtenu la lettre informant le soumissionnaire RC PORTUGAFRIQUE du rejet de son offre pour la DRP « <b>Travaux de maintenance des périmètres irrigués</b> » d'un montant de 31 122 500 TTC.</p>	<p>Nous recommandons à la SAED d'informer tous les candidats non retenus du rejet de leur offre par lettre contre décharge.</p>	<p><i>La SAED, conformément au code informe les candidats non retenus du rejet de leur offre comme vous avez eu à le constater dans votre revue de conformité.</i></p> <p><i>Pour cette DRP, il s'agit certainement d'une omission. A l'avenir nous corrigerons ce manquement.</i></p>

### 5.1.2 Recommandations relatives aux rapports et observateurs indépendants

Constats	Recommandations	Commentaires de la SAED
Les rapports trimestriels ont été produits toutefois, nous n'avons pas obtenu le courrier de transmission de ces rapports à la DCMP et à l'ARMP conformément à l'arrêté N°011586 du 28/12/2007 pris en application de l'article 35 du CMP relatif aux CPM des Autorités Contractantes.	Nous recommandons à la SAED de transmettre les rapports trimestriels produits à la DCMP et à l'ARMP tout en assurant une matérialisation de cette transmission.	<i>Les rapports trimestriels sont transmis à l'ARMP et à la DCMP par voie officielle et sont enregistrés par notre bureau du courrier.</i>
Le manuel des procédures de la SAED n'est pas à jour, au regard du Code des Marchés en vigueur.	Nous recommandons à la SAED de mettre à jour son manuel de procédure en conformité au CMP en vigueur.	<i>Le manuel sera mis à jour durant l'exercice 2013.</i>

### 5.1.3 Recommandations concernant le déroulement des audits à posteriori

Cf. rapport de synthèse du groupe I.

## 5.2 Recommandations relatives au fractionnement

Nous n'avons pas relevé de cas de fractionnement par conséquent, nous n'avons pas de recommandations particulières à formuler.

## 5.3 Recommandations relatives à la capacité de gestion du processus de passation des marchés

Cf. rapport de synthèse du groupe I.

## 5.4 Recommandations relatives à l'attribution des marchés

Nous n'avons pas de recommandations particulières à formuler sur l'attribution des marchés.

## 5.5 Recommandations relatives au renforcement de la régulation

Cf. rapport de synthèse du groupe I.

## 6. ANNEXE : LISTE DES MARCHES CONTROLES

### 6.1 Liste des DRP contrôlées

N° d'ordre	Objet du marché	Nature du marché	Attributaire	Montant TTC en F CFA
1	Travaux de maintenance de périmètres irrigues	Travaux	ENTREPRISE THIAYTOU	31 122 500
2	Matériel et Mobiliers de bureau	Fournitures	Moussabou Buro	8 931 100
3	Clôture de la base vie de N'Diaye	Travaux	Entreprise Saint-Louisienne de TP	12 916 220
4	Consommables informatiques	Fournitures	ETS SALAM	3 150 600
5	Consommables informatiques	Fournitures	Y DIOR COMS	5 218 621
6	Edition de documents de vingt six POAS	Fournitures	IMPRIMERIE DU FLEUVE	20 862 400
7	Recrutement d'un prestataire pour la conception et le développement d'un outil de gestion de base de données de CGERV	Services	AGIF Informatique	16 375 000
8	Formation d'un agent sur Oracle version 10g	Services	HBO Technology	5 310 000
<b>TOTAL</b>				<b>103 886 441</b>

## 6.2 Liste des appels d'offres contrôlés

N°	Objet du marché	Nature du marché	Attributaire	Montant TTC F CFA
1	Travaux de terrassement et de génie civil du périmètre et contrction de batiments au projet de N'Diawar Lot1	Travaux	RC CONSTRUCTION	2 735 589 802
2	Equipements électriques et électromécaniques des stations de pompage du proet de N"Diawar Lot 2	Fourniture	SAHE SARL	507 402 348
3	Travaux terrassement et génie civil de la station de traitement de l'ouvrage de stockage et du réseau de distribution du prijet de N'Diawar Lot 3	Travaux	CSTI	535 533 763
4	Equipements électriques et électromécaniques de la station de traitement d'eau Lot 4	Fourniture	SAHE SARL	62 927 040
5	Travaux de curage ,de faucardage et d'endiguement du Gorom Aval	Travaux	EIFPAGE SENEGAL	3 055 318 842
6	Fourniture, livraison et installation des équipements électromécaniques et électriques	Fourniture	EIFPAGE SENEGAL	1 423 213 620
7	Travaux de terrassement et de génie civil pour l'aménagement des réseaux secondaires d'alimentation et de drainage ainsi que des pistes de desserte de 2500 ha d'irrigation privée dans la zone du Gorom Aval	Travaux	RC CONSTRUCTION	5 186 693 990

N°	Objet du marché	Nature du marché	Attributaire	Montant TTC FCFA
8	Travaux de maintenance des adducteurs et émissaires de drainage dans la délégation de Dagana lot 1	Travaux	ESIES	57 879 000
9	Travaux de maintenance des adducteurs et émissaires de drainage dans la délégation de Dagana lot 3	Travaux	E S I	112 867 000
10	Travaux de maintenance des adducteurs et émissaires de drainage dans la délégation de Dagana lot 2	Travaux	EIFFAGE SENEGAL	165 955 200
11	Travaux de maintenance des infrastructures d'intérêt général dans la délégation de Dagana lot 1	Travaux	ENTREPRISE THIAYTOU	102 306 000
12	Travaux de maintenance des infrastructures d'intérêt général dans la délégation de Podor lot 2	Travaux	ENTREPRISE THIAYTOU	83 721 000
13	Travaux de maintenance des périmètres irrigués dans la délégation de Matam lot 2(fompi)	Travaux	ESI SARL	40 474 000
14	Contrôle des travaux de maintenance des infrastructures hydroagricoles dans les délégations de Dagana et Podor lot 2	Service	GPT/APAVE/SAHEL/SED	27 494 000
15	Fourniture de véhicules à la SAED	Fourniture	CFAO	64 494 603
<b>TOTAL</b>				<b>14 161 870 208</b>
